

ОТЧЕТ о ходе реализации инвестиционных программ участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ (за 1-й квартал 2019 года)

Тепловые генерирующие компании (ОГК/ТГК) и компания, осуществляющая деятельность по экспорту/импорту энергии, заключили Агентские договоры (далее – АД) с целью поставки мощности по договорам о предоставлении мощности (далее – ДПМ). Всего было заключено 34 Агентских договора, из которых: 23 договора, обеспечивающих реализацию инвестиционных программ ОГК/ТГК (с контролем строительства), и 11 договоров, обеспечивающих заключение и исполнение ДПМ введенных в эксплуатацию генерирующих объектов (без контроля строительства). Данные договоры были заключены 01.11.2010 г. в соответствии с Правилами оптового рынка и условиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка в отношении объектов генерации, включенных в Распоряжение Правительства от 11.08.2010 г. № 1334-р. В связи с реорганизацией Принципалов и изменением состава договоров к настоящему времени генерирующими компаниями заключено 44¹ Агентских договора. Общий объем генерирующих мощностей, который планируется ввести в срок до конца 2019 г. в рамках реализации обязательств по заключенным ДПМ составил 29 876,75 МВт, по 136 объектам генерации (подробнее см. рис.1).

Рис. 1 «График вводов мощности с учетом переносов сроков начала поставки мощности, МВт. 2007-2019 гг.»



Источник: данные компаний

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ ЗА 1-й квартал 2019 года.

План вводов на 2019 год составляет 360 МВт по 2-м объектам генерации. Из них на 1-й квартал 2019 года запланирован пуск 1-го объекта установленной мощностью 180 МВт. Запланированный объект генерации аттестован без задержек. Также в отчетном периоде введен 1 объект установленной мощностью 115 МВт, запланированный на 2014 год. Таким образом, в 2019 году генерирующие компании обеспечили ввод в эксплуатацию 2-х объектов генерации общей установленной мощностью 295 МВт (подробнее см. рис.2).

¹ Без учета 2-х договоров, прекративших свое действие в связи с односторонним отказом от исполнения обязательств по ДПМ и переходом на КОМ.

Рис. 2 «Введенные в 2019 году объекты генерации»



Источник: данные компаний

Из запланированных к 01 апреля 2019 г. 135 объектов общей установленной мощностью 29 696,75 МВт, генерирующие компании ввели в эксплуатацию 134 объекта генерации, или 29 473,75 МВт установленной мощности. Не выполнила свои обязательства 1 компания по 1-му объекту установленной мощностью 223 МВт. При этом, процент выполнения планов вводов к 01 апреля 2019 г. составил 99,25%.

Таким образом, генерирующие компании на конец 1-го квартала 2019 года выполнили свои обязательства по суммарной инвестиционной программе с 2007 г. по 2019 г. на 98,65%.


ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ В 2018 ГОДУ.

За несоблюдение сроков начала поставки мощности по ДПМ в 2019 году было оплачено 30,3 млн. руб. Всего с даты заключения договоров за несоблюдение сроков начала поставки мощности по ДПМ было оплачено 20 503,9 млн. руб. штрафов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ДПМ В 2018 ГОДУ.

На 1-ый квартал 2019 года было запланировано финансирование в размере 3,8 млрд. руб. Фактически было профинансировано 2,8 млрд. руб., или 74%.

Рис.3 «Объем инвестиционной программы генерирующих компаний: соотношение плановых и фактических объемов финансирования по состоянию на конец 1-го квартала 2019 г., млрд. руб.»

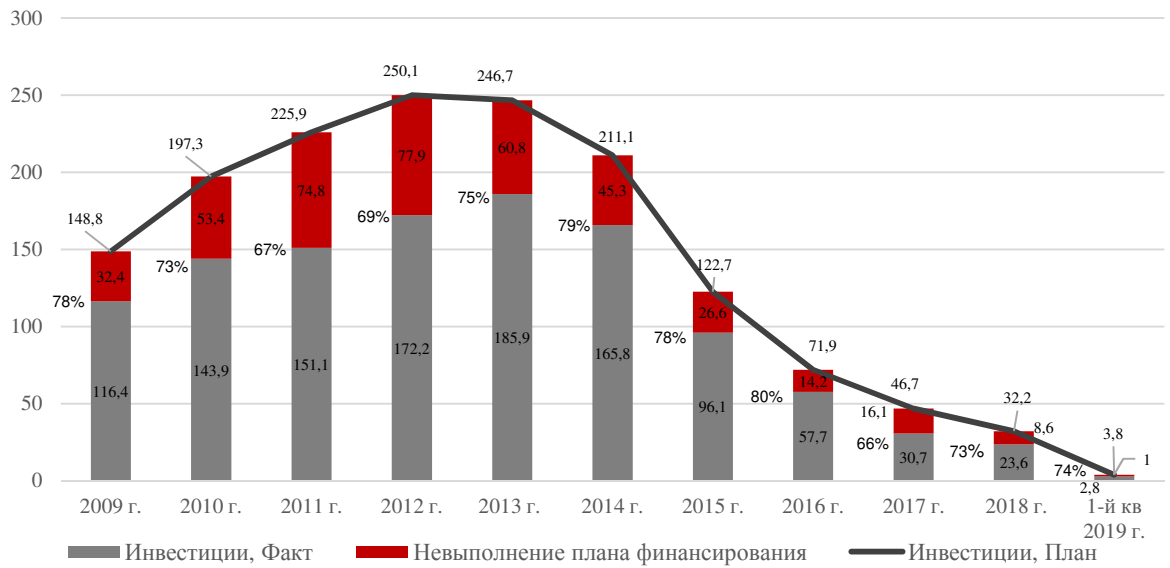

Источник: данные компаний
