

## ОТЧЕТ

### о ходе реализации отобранных инвестиционных проектов участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО (за 2 квартал 2019 года)

#### I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Правила оптового рынка), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172 Коммерческим оператором ежегодно начиная с 2013 г. проводятся конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – ОПВ).

ОПВ проводится на 4 года вперед отдельно для каждого вида генерирующих объектов, функционирующих на основе использования разных видов возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ):


- фотоэлектрического преобразования энергии солнца (объект солнечной генерации);
- энергии ветра (объект ветровой генерации);
- энергии потоков воды (в том числе энергии сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электростанциях (генерирующий объект гидрогенерации).

Целевые показатели величин объемов ввода объектов ВИЭ и предельные величины капитальных затрат, используемые в целях проведения ОПВ, определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р.

Во 2 квартале 2019 г. проведен ежегодный ОПВ на 2020-2024 гг. По итогам отобрано 3 объекта ДПМ ВИЭ с датой начала поставки мощности в 2022 и 2024 гг., суммарный объем установленной мощности составил 85 МВт.

По итогам ОПВ, проведенных в 2013-2019 гг., отобрано 232 объекта ДПМ ВИЭ с датой начала поставки мощности в 2014-2024 гг., суммарный объем установленной мощности отобранных объектов составил 5 403 МВт. (подробнее см. рис.1).

Рис. 1 «Итоги ОПВ за 2013-2019 гг., МВт (количество объектов)»

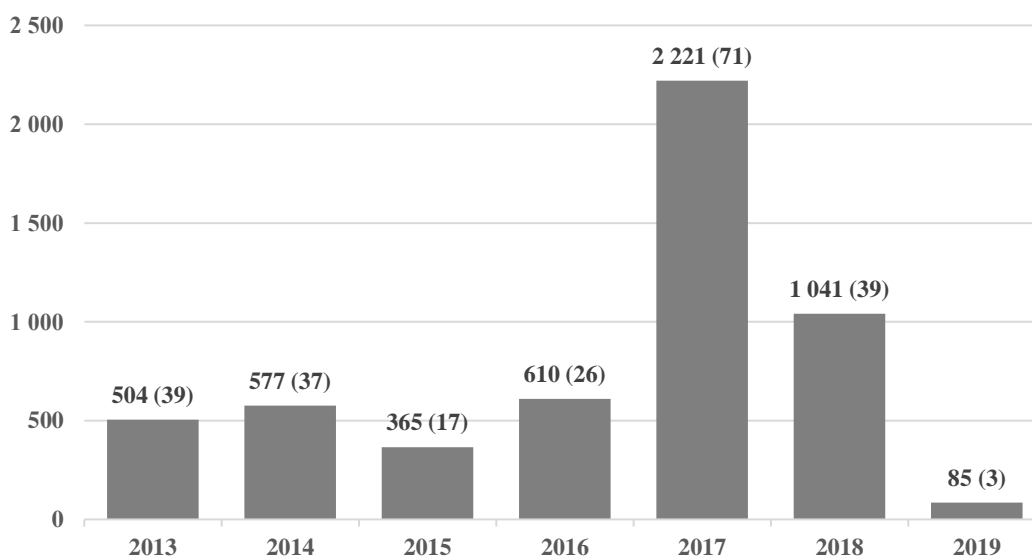


Среди отобранных объектов генерации:

- 105 объектов ветровой генерации общей установленной мощностью 3 376 МВт;
- 116 объектов солнечной генерации общей установленной мощностью 1 858 МВт;
- 11 объектов гидрогенерации общей установленной мощностью 169 МВт

## II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

По состоянию на 30.06.2019 введено 789 МВт что составляет 63,8% от плана за соответствующий период или 14,6 % от общего плана вводов (подробнее см. рис. 2).

Рис. 2 «Плановые и фактические показатели ввода мощности в 2014-2024 гг. в МВт».

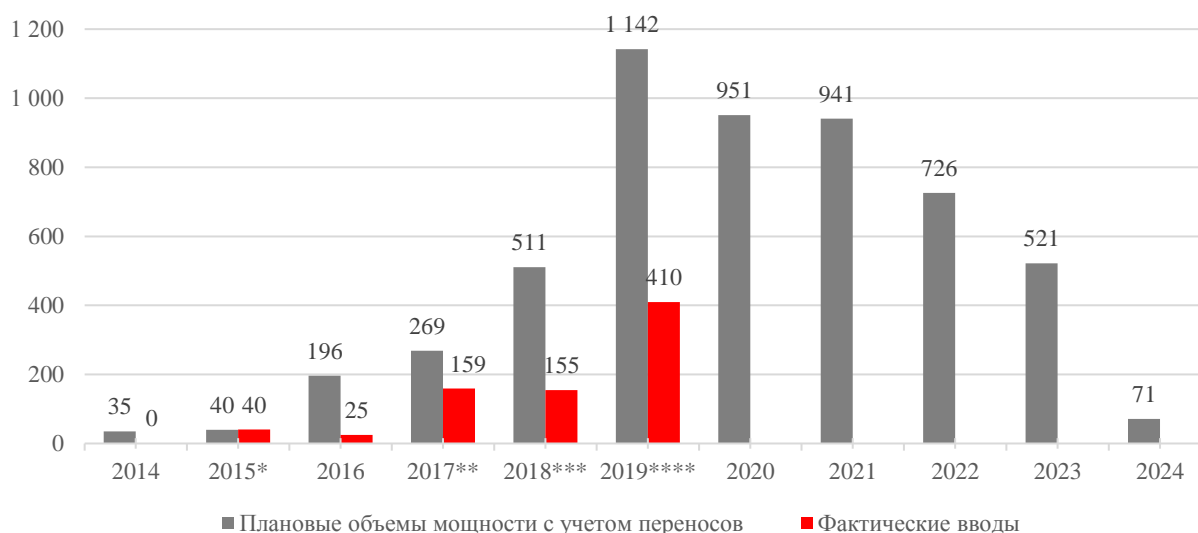

\* С учетом ввода объекта генерации, запланированного к вводу в 2014 г.

\*\* С учетом вводов объектов генерации, запланированных к вводу в 2016 г.

\*\*\* С учетом вводов объектов генерации, запланированных к вводу в 2016 и в 2017 гг.

\*\*\*\* С учетом вводов объектов генерации, запланированных к вводу в 2017 и в 2018 гг.

На 2 кв. 2019 г. был запланирован ввод 4 объектов генерации установленной мощностью 50 МВт. Фактически введено 6 объектов генерации установленной мощностью 80 МВт, из которых 2 объекта генерации мощностью 30 МВт, запланированных к вводу в предыдущие периоды.

План 2 квартала 2019 г. с учетом введенных объектов генерации, запланированных к вводу в предыдущие периоды выполнен на 160%.

Сроки начала поставки мощности по состоянию на 30.06.2019 г. нарушили 6 компаний по 17 объектам генерации, общей мощностью 325,64 МВт. Количество месяцев нарушения по каждому объекту составляет 7 месяцев. Во 2 квартале 2019 г. ни у одной компании не произошло ни одного переноса срока начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ, а также ни одного изменения месторасположения объектов генерации по ДПМ ВИЭ. Передача прав и обязанностей продавца по ДПМ ВИЭ осуществлена по 3 компаниям и 8 объектам (без учета проведенных реорганизаций юридических лиц).

По 8 объектам генерации общей установленной мощностью 136 МВт прекращены и/или отсутствуют действующие ДПМ ВИЭ.

### III. ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

За нарушение сроков начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ во 2 квартале 2019 г. было рассчитано 527,2 млн. рублей штрафов (что составляет 12,1% от общего объема рассчитанных штрафов) и списано 571,2 млн. рублей штрафов (что составляет 108,4% от рассчитанных во 2 квартале штрафов). Всего за период в 2015 – 1 пол. 2019 г. было рассчитано 4 372,3 млн. рублей и списано 4 108,1 млн. рублей штрафов. Уровень оплаты за весь период составляет 94%.

### IV. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ) ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Особенности проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления (далее – ОПТБО), установлены Правилами оптового рынка.

По итогам ОПТБО, проведенного в 2017 г., отобрано 5 объектов ДПМ ТБО с плановой датой начала поставки в 2022 году, суммарный объем установленной мощности которых составляет 335 МВт.

По информации, полученной от АО «АТС» 17.07.2018 г., в связи с отсутствием заявок по результатам конкурсного отбора в 2018 г. не было отобрано ни одного проекта.

Во 2 квартале 2019 г. не поступали основания для изменения информации по ОПТБО.
