

ОТЧЕТ

о ходе реализации отобранных инвестиционных проектов участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО (за 1 квартал 2020 года)

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Правила оптового рынка), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172 Коммерческим оператором ежегодно начиная с 2013 г. проводятся конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – ОПВ).


ОПВ проводится на 4 года вперед отдельно для каждого вида генерирующих объектов, функционирующих на основе использования разных видов возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ):

- фотоэлектрического преобразования энергии солнца (объект солнечной генерации);
- энергии ветра (объект ветровой генерации);
- энергии потоков воды (в том числе энергии сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электростанциях (генерирующий объект гидрогенерации).

Целевые показатели величин объемов ввода объектов ВИЭ и предельные величины капитальных затрат, используемые в целях проведения ОПВ, определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р.

По итогам ОПВ, проведенных в 2013-2019 гг., отобрано 232 объекта ДПМ ВИЭ с датой начала поставки мощности в 2014-2024 гг., суммарный объем установленной мощности отобранных объектов составил 5 403 МВт. (подробнее см. рис. 1).

Рис. 1 «Итоги ОПВ за 2013-2019 гг., МВт (количество объектов)»

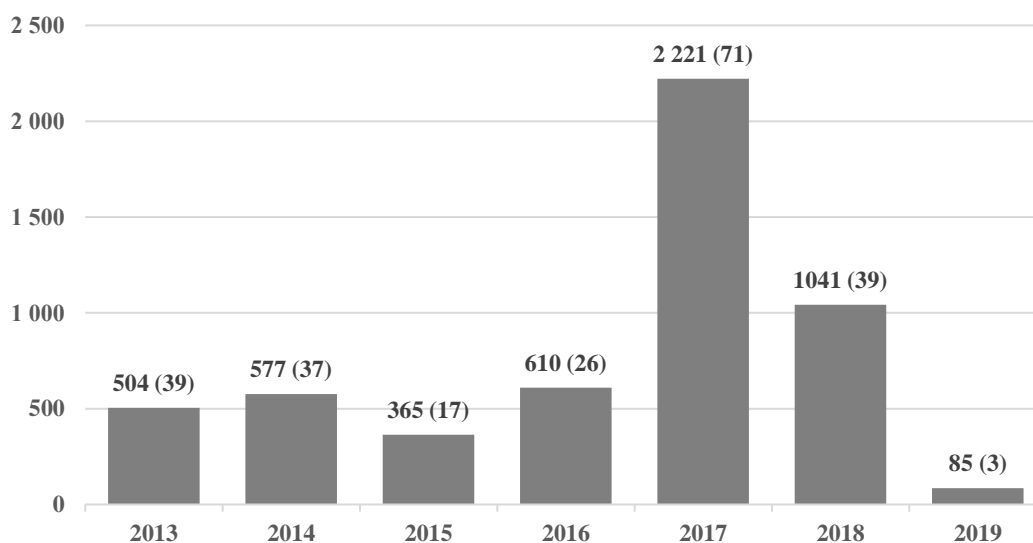


Среди отобранных объектов генерации:

- 105 объектов ветровой генерации общей установленной мощностью 3 376 МВт;
- 116 объектов солнечной генерации общей установленной мощностью 1 858 МВт;
- 11 объектов гидрогенерации общей установленной мощностью 169 МВт

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

По состоянию на 31.03.2020 введено 1 335,2 МВт, что составляет 68% от плана за соответствующий период или 25,7 % от общего плана вводов (с учетом изменений, связанных с прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ по 13 объектам генерации общей установленной мощностью 211 МВт) (подробнее см. рис.2).

Рис. 2 «Плановые и фактические показатели ввода мощности в 2014-2024 гг. в МВт»¹.

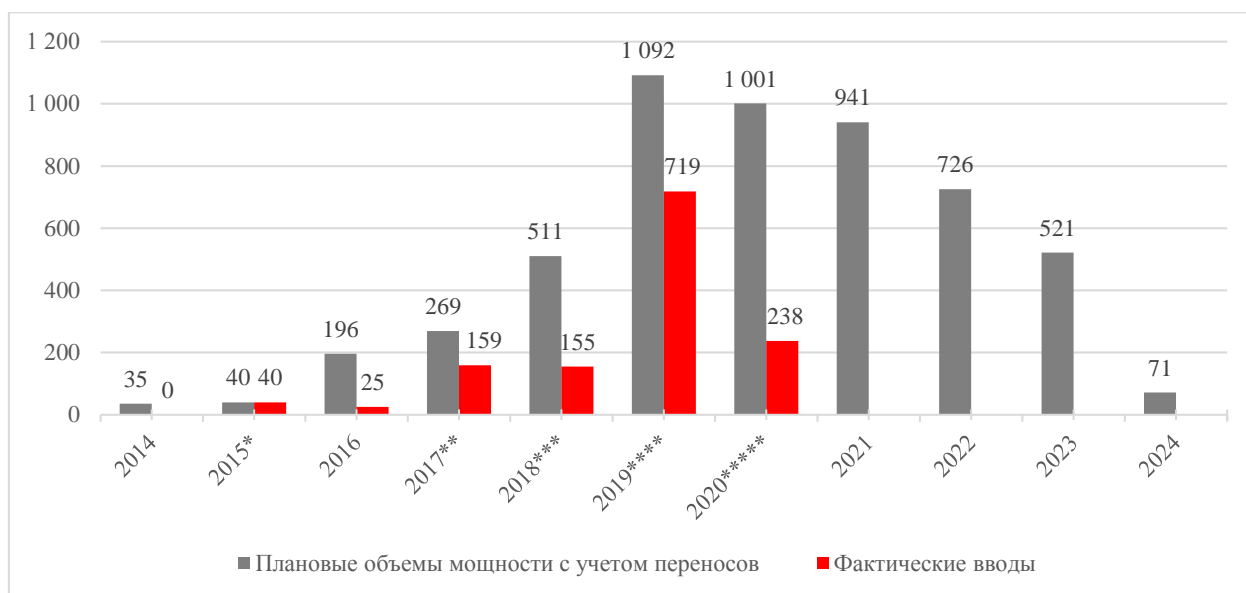

* С учетом ввода объекта генерации, запланированного к вводу в 2014 г.

** С учетом вводов объектов генерации, запланированных к вводу в 2016 г.

*** С учетом вводов объектов генерации, запланированных к вводу в 2016 и в 2017 гг.

**** С учетом вводов объектов генерации, запланированных к вводу в 2017 и в 2018 гг.

***** С учетом вводов объектов генерации, запланированных к вводу в 2018 и в 2019 гг.

По состоянию на 31.03.2020 даты начала поставки мощности нарушили 7 компаний по 27 объектам генерации общей установленной мощностью 626,94 МВт. Количество месяцев нарушения по объектам составляет от 4 до 16 месяцев.

В 1 квартале 2020 г. был запланирован ввод 1 объекта генерации установленной мощностью 15 МВт. Фактически введено 10 объектов генерации установленной мощностью 237,5 МВт, из них

¹ В плановых показателях объема мощности на рис.2 не отражены изменения, связанные с прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ.

9 объектов генерации установленной мощностью 222,5 МВт, запланированные к вводу в предыдущие периоды.

План 1 квартала 2020 г. с учетом введенных объектов генерации, запланированных к вводу в предыдущие периоды перевыполнен в 16 раз.

В 1 квартале 2020 г.:

- изменений дат начала поставки мощности и месторасположений не осуществлялось;
- передача прав и обязанностей продавца по ДПМ ВИЭ новому продавцу осуществлялась по 1 компании по 1 объекту общей установленной мощностью 25 МВт.

III. ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

За нарушение дат начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ в 1 квартале 2020 г. было рассчитано 1 357,5 млн. рублей штрафов (что составляет 20,7% от общего объема рассчитанных штрафов) и списано 1 363,5 млн. рублей штрафов (что составляет 100,4% от рассчитанных в 1 квартале 2020 г. штрафов). Всего за период в 2015 – 1 кварт.2020 гг. было рассчитано 6 565,2 млн. рублей и списано 6 313,2 млн. рублей штрафов. Уровень оплаты за весь период составляет 96,2 %.

ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ) ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Особенности проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления (далее – ОПТБО), установлены Правилами оптового рынка.

По итогам ОПТБО, проведенного в 2017 г., отобрано 5 объектов ДПМ ТБО с плановой датой начала поставки в 2022 году, суммарный объем установленной мощности которых составляет 335 МВт.

По информации, полученной от АО «АТС» 17.07.2018 г., в связи с отсутствием заявок по результатам конкурсного отбора в 2018 г. не было отобрано ни одного проекта.

В 1 квартале 2020 г. не поступали основания для изменения информации по ОПТБО.
