

ОТЧЕТ о ходе реализации инвестиционных программ участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ (за 1 полугодие 2018 года)

Тепловые генерирующие компании (ОГК/ТГК) и компания, осуществляющая деятельность по экспорту/импорту энергии, заключили Агентские договоры (далее – АД) с целью поставки мощности по договорам о предоставлении мощности (далее – ДПМ). Всего было заключено 34 Агентских договора, из которых: 23 договора, обеспечивающих реализацию инвестиционных программ ОГК/ТГК (с контролем строительства), и 11 договоров, обеспечивающих заключение и исполнение ДПМ введенных в эксплуатацию генерирующих объектов (без контроля строительства). Данные договоры были заключены 01.11.2010 г. в соответствии с Правилами оптового рынка и условиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка в отношении объектов генерации, включенных в Распоряжение Правительства от 11.08.2010 г. № 1334-р. В связи с реорганизацией Принципалов и изменением состава договоров к настоящему времени генерирующими компаниями заключено 44¹ Агентских договора. Общий объем генерирующих мощностей, который планируется ввести в срок до 2019 г. в рамках реализации обязательств по заключенным ДПМ составил 29 876,75 МВт, по 136 объектам генерации (подробнее см. рис.1).

Рис. 1 «График вводов мощности с учетом переносов сроков начала поставки мощности (увеличение установленной мощности по годам), МВт. 2007-2019 гг.»



Источник: данные компаний

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 года.

План вводов на 2018 год составляет 230,00 МВт по 2-м объектам генерации. Все пуски запланированы на 3-ий квартал. В отчетном периоде введены 2 объекта, запланированные на 2017 год, общей установленной мощностью 420,00 МВт. Таким образом, в 1 полугодии 2018 года генерирующие компании обеспечили ввод в эксплуатацию 2-х объектов генерации общей установленной мощностью 420,00 МВт (подробнее см. рис.2).

¹ Без учета 2-х договоров, прекративших свое действие в связи с односторонним отказом от исполнения обязательств по ДПМ и переходом на КОМ.


Рис. 2 «Введенные в 2018 году объекты генерации»



Источник: данные компаний


Из запланированных к 01 июля 2018 г. 132 объектов общей установленной мощностью 29 286,75 МВт, генерирующие компании ввели в эксплуатацию 130 объектов генерации, или 28 948,75 МВт установленной мощности. Не выполнила свои обязательства 1 компания по 2-м объектам суммарной мощностью 338,00 МВт, запланированных к вводу.

Рис. 3 «Суммарное выполнение инвестиционных программ в рамках ДПМ: ввод мощностей на конец 2 квартала 2018 г.», в МВт.

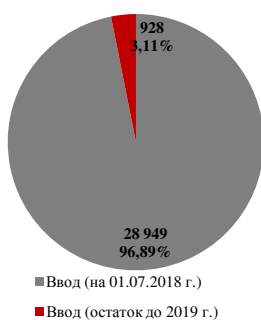

Источник: данные компаний

Рис. 4 «Выполнение планов вводов объектов в рамках ДПМ на конец 2 квартала 2018 г.», в МВт.

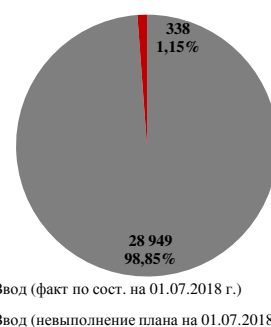

Источник: данные компаний

Таким образом, генерирующие компании на конец 2 квартала 2018 года выполнили свои обязательства по суммарной инвестиционной программе с 2007 г. по 2019 г. на 96,89%. При этом, процент выполнения планов вводов к 01 июля 2018 г. составил 98,85%.


ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ В 2018 ГОДУ.

За несоблюдение сроков начала поставки мощности по ДПМ в 2018 г. было оплачено 1 464,48 млн. руб. Всего с даты заключения договоров за несоблюдение сроков начала поставки мощности по ДПМ было оплачено 19 042,95 млн. руб. штрафов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ДПМ В 2018 ГОДУ.

Ожидаемый объем финансирования инвестиционных программ по объектам ДПМ, рассчитанный до 2019 г. составляет 1 322,07 млрд. руб., из которых по состоянию на конец 2 квартала 2018 г. профинансировано 1 219,92 млрд. руб., или 92,27% общей стоимости инвестиционных программ. На 1 полугодие 2018 года было запланировано финансирование в размере 23,96 млрд. руб. Фактически было профинансировано 10,53 млрд. руб., или 43,95%.

Рис.5 «Объем инвестиционной программы генерирующих компаний: соотношение плановых и фактических объемов финансирования по состоянию на конец 1 полугодия 2018 г., млрд. руб.»

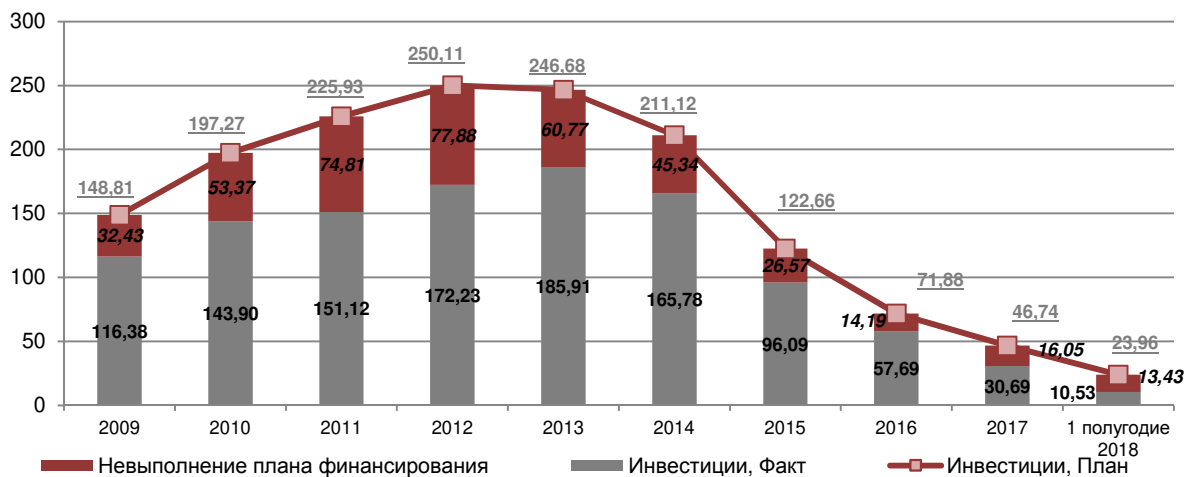

Источник: данные компаний

Общий объем финансирования инвестиционной программы по объектам ДПМ, рассчитанной до 2019 г. за счет средств, полученных в результате размещения дополнительных эмиссий акций («целевые средства») составляет – 446,7 млрд. руб., или 33,80% от общего необходимого объема финансирования.
