

## ОТЧЕТ о ходе реализации инвестиционных программ участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ (за 1-е полугодие 2017 года)

Тепловые генерирующие компании (ОГК/ТГК) и компания, осуществляющая деятельность по экспорту/импорту энергии, заключили Агентские договоры (далее – АД) с целью поставки мощности по договорам о предоставлении мощности (далее – ДПМ). Всего было заключено 34 Агентских договора, из которых: 23 договора, обеспечивающих реализацию инвестиционных программ ОГК/ТГК (с контролем строительства), и 11 договоров, обеспечивающих заключение и исполнение ДПМ введенных в эксплуатацию генерирующих объектов (без контроля строительства). Данные договоры были заключены 01.11.2010 г. в соответствии с Правилами оптового рынка и условиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка в отношении объектов генерации, включенных в Распоряжение Правительства от 11.08.2010 г. № 1334-р. В связи с реорганизацией Принципалов и изменением состава договоров к настоящему времени генерирующими компаниями заключено 43<sup>1</sup> Агентских договора. Общий объем генерирующих мощностей, которые планируется ввести в срок до 2018 г. в рамках реализации обязательств по заключенным ДПМ составил 29 876,75 МВт (подробнее см. рис.1).

**Рис. 1 «График вводов мощности с учетом переносов сроков начала поставки мощности (увеличение установленной мощности по годам), МВт. 2007-2018 гг.»**



*Источник: данные компаний*

### ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ ЗА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА.

План вводов на 2017 год составляет 1 640,00 МВт по 4-м объектам генерации. На 1-е полугодие 2017 года были запланированы пуски по 3-м объектам общей установленной мощностью 1 430 МВт. Аттестован 1 объект установленной мощностью 420 МВт. Также в отчетном периоде введены 2 объекта, запланированные на 2014 и 2016 годы, общей установленной мощностью 565,00 МВт. Таким образом, в 2017 году генерирующие компании обеспечили ввод в эксплуатацию 3-х объектов генерации общей установленной мощностью 985,00 МВт (подробнее см. рис.2).

<sup>1</sup> Без учета 2-х договоров, прекративших свое действие в связи с односторонним отказом от исполнения обязательств по ДПМ и переходом на КОМ.


**Рис. 2 «Введенные в 2017 году объекты генерации»**



*Источник: данные компаний*

Всего к 01 июля 2017 г. генерирующие компании ввели в эксплуатацию 127 объектов генерации, или 27 728,75 МВт установленной мощности, из запланированных к вводу 131 объекта общей установленной мощностью 29 076,75 МВт. Не выполнили свои обязательства 3 компании по 4-м объектам суммарной мощностью 1 348,00 МВт, запланированных к вводу.


**Рис. 3 «Суммарное выполнение инвестиционных программ в рамках ДПМ: ввод мощностей на конец 1-го полугодия 2017 г.», в МВт.**

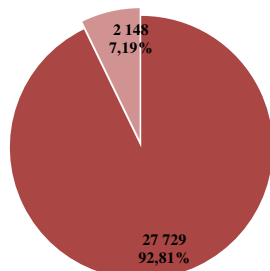

■ Ввод (на конец 2-го кв. 2017 г.)  
 ■ Ввод (остаток до 2018 г.)

*Источник: данные компаний*

**Рис. 4 «Выполнение планов вводов объектов в рамках ДПМ в 1-м полугодии 2017 г.», в МВт.**

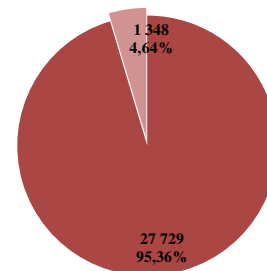

■ Ввод (факт по сост. на 01.07.17)  
 ■ Ввод (невыполнение плана на 01.07.17)

*Источник: данные компаний*

Таким образом, генерирующие компании на конец 2-го квартала 2017 года выполнили свои обязательства по суммарной инвестиционной программе с 2007 г. по 2018 г. на 92,81%. При этом, процент выполнения планов вводов к 01 июля 2017 г. составил 95,36%.


## ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ В 1-м ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА.

За несоблюдение сроков начала поставки мощности по ДПМ в 2017 г. было списано 421,12 млн. руб. Всего с даты заключения договоров за несоблюдение сроков начала поставки мощности по ДПМ было списано 15 430,83 млн. руб. штрафов.

## ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ДПМ В 1-м ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА.

Ожидаемый объем финансирования инвестиционных программ по объектам ДПМ, рассчитанный до 2018 г. составляет 1 316,35 млрд. руб., из которых по состоянию на конец 2-го квартала 2017 г. профинансировано 1 195,14 млрд. руб., или 90,79% общей стоимости инвестиционных программ. На 1-е полугодие 2017 года было запланировано финансирование в размере 33,08 млрд. руб. Фактически было профинансировано 19,48 млрд. руб., или 58,89%.


Рис.5 «Объем инвестиционной программы генерирующих компаний: соотношение плановых и фактических объемов финансирования по состоянию на конец 1-го полугодия 2017 г., млрд. руб.»

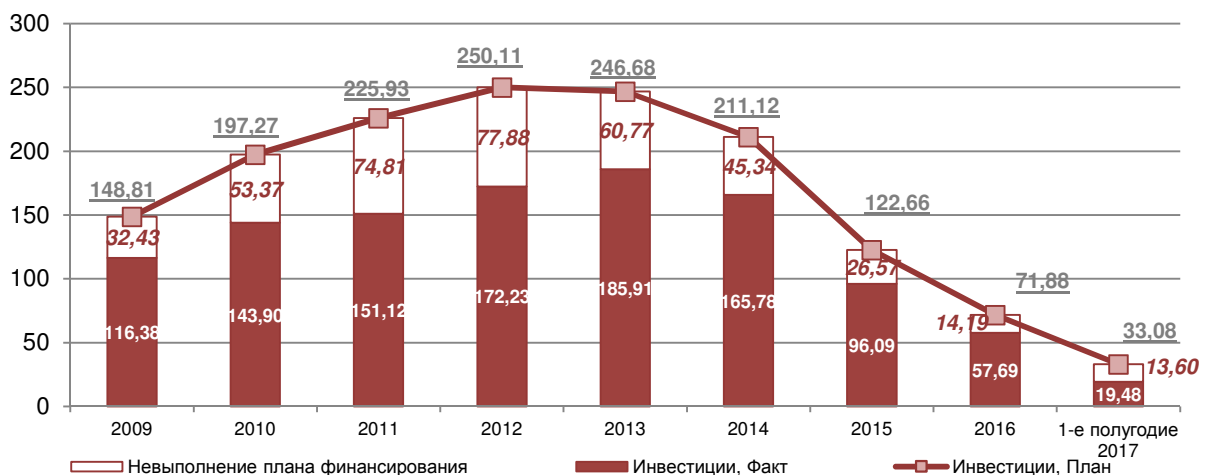

Источник: данные компаний

Общий объем финансирования инвестиционной программы по объектам ДПМ, рассчитанной до 2018 г. за счет средств, полученных в результате размещения дополнительных эмиссий акций («целевые средства») составляет – 446,7 млрд. руб., или 33,93% от общего необходимого объема финансирования.

**Рис.6 «Финансирование инвестиционной программы генерирующих компаний», в млрд. руб.**

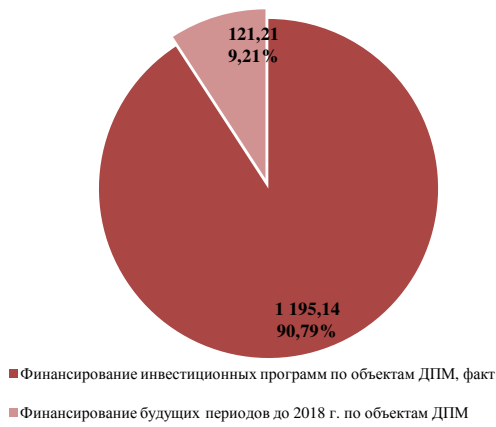

*Источник: данные компаний*
