

## ОТЧЕТ

### о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 2024 года.

#### I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущены отборы проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций. Заключение и сопровождение договоров на модернизацию осуществляется АО «ЦФР» на основании выполнения функции Поверенного по договорам коммерческого представительства.


По итогам отборов было отобрано 127 объектов генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2028 годах, суммарный объем установленной мощности составил 26 832,2 МВт (подробнее см. рис.1), в том числе:

- первая ценовая зона 89 объектов генерации установленной мощностью 21 767,3 МВт;
- вторая ценовая зона 38 объектов генерации установленной мощностью 5 064,9 МВт.

Разделение отобранных объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 87 объектов генерации установленной мощностью 21 137,3 МВт;
- уголь – 40 объектов генерации установленной мощностью 5 694,9 МВт.

**Рис. 1 Плановый объем мощности модернизируемых объектов генерации по результатам отборов, МВт.**

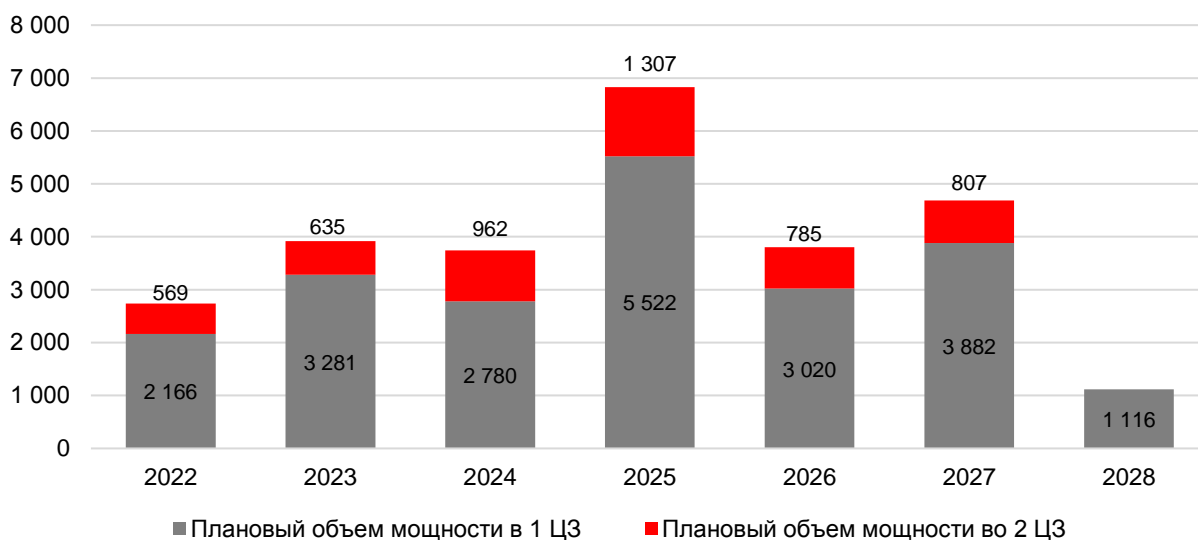

## II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

На 2024 год был запланирован ввод 13 объектов генерации общей установленной мощностью 2 062 МВт. Из запланированных на 2024 год введены 9 объектов генерации установленной мощностью 1 627 МВт. Дополнительно в 2024 году введены 2 объекта общей установленной мощностью 249,8 МВт, запланированные к вводу в 2022-2023 годах. Таким образом в 2024 году введены 11 объектов общей установленной мощностью 1 876,8 МВт. Исполнение плана 2024 года составляет 91%.

**Рис. 2 Плановый (с учетом изменения периодов модернизации и поставки мощности, а также параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.**



Всего по состоянию на 31.12.2024 введен 31 объект генерации общей установленной мощностью 6 408,2 МВт, при плане в 35 объектов генерации общей установленной мощностью 6 843,2 МВт. Исполнение плана составляет 93,6%.

По состоянию на 31.12.2024 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 24,7%, при общем плане ввода 126 объектов генерации суммарной установленной мощностью 25 982,2 МВт.

По состоянию на 31.12.2024 даты начала поставки мощности нарушили 3 компании по 4 объектам генерации, общей мощностью 435 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 1 до 9 месяцев.

По состоянию на 31.12.2024 на стадии модернизации находится 36 объектов общей установленной мощностью 6 546,9 МВт, в том числе:

- 32 объекта общей установленной мощностью 6 111,9 МВт с плановым периодом модернизации;
- 4 объекта установленной мощностью 435 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Изменения параметров договоров в 2024 году:

- По инициативе участника в 2024 году изменена дата окончания поставки мощности в связи с уменьшением периода поставки по 1 объекту генерации установленной мощностью 80 МВт, изменены даты начала реализации проекта по 1 объекту установленной мощностью 195 МВт, а также изменены даты начала и окончания поставки мощности по 3 объектам генерации общей установленной мощностью 290 МВт;
- По инициативе СО были изменены даты начала периода реализации проекта, начала и окончания поставки мощности по 3 объектам генерации установленной мощностью 487 МВт.

- По распоряжению Правительства РФ из перечня объектов КОММод исключён генерирующий объект установленной мощностью 850 МВт.

### III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

Штрафов по КОММод в 2024 г. было рассчитано и оплачено / прекращено / прекращен учет обязательств на сумму 154,1 млн. рублей (что составляет 54,5% от общего объема рассчитанных штрафов). В период с 2022 – 2024 гг. было рассчитано и оплачено / прекращено / прекращен учет обязательств на сумму 282,6 млн. рублей (уровень оплаты – 100%).
