

ОТЧЕТ

о ходе реализации отобранных инвестиционных проектов участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО (за 2025 г.)

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Правила оптового рынка), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172 Коммерческим оператором начиная с 2013 г. проводятся конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – ОПВ).

ОПВ проводится на 4 года вперед отдельно для каждого вида генерирующих объектов, функционирующих на основе использования разных видов возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ):

- фотоэлектрического преобразования энергии солнца (объект солнечной генерации);
- энергии ветра (объект ветровой генерации);
- энергии потоков воды (в том числе энергии сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электростанциях (генерирующий объект гидрогенерации).


Целевые показатели величин объемов ввода объектов ВИЭ и предельные величины капитальных затрат, используемые в целях проведения ОПВ, определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р.

В 2025 г. проведены основной и дополнительный (для Дальневосточного федерального округа) ОПВ, в результате которых было отобрано 55 объектов ДПМ ВИЭ с датой начала поставки мощности 2026-2031 гг., суммарный объем установленной мощности которых составил 1 883,05 МВт. Всего в 2025 г. отобрано объектов генерации по видам:

- 10 объектов ветровой генерации общей установленной мощностью 769,48 МВт;
- 44 объекта солнечной генерации общей установленной мощностью 1 108,52 МВт;
- 1 объект гидрогенерации общей установленной мощностью 5,05 МВт.

Всего по итогам ОПВ, проведенным в 2013 – 2021, 2023, 2024, 2025 гг., отобрано 419 объектов ДПМ ВИЭ с датой начала поставки мощности 2014-2031 гг., суммарный объем установленной мощности составил 12 545,9 МВт (подробнее см. рис.1).

Рис. 1 «Итоги ОПВ за 2013 – 2021, 2023, 2024, 2025 гг., МВт (количество объектов)».

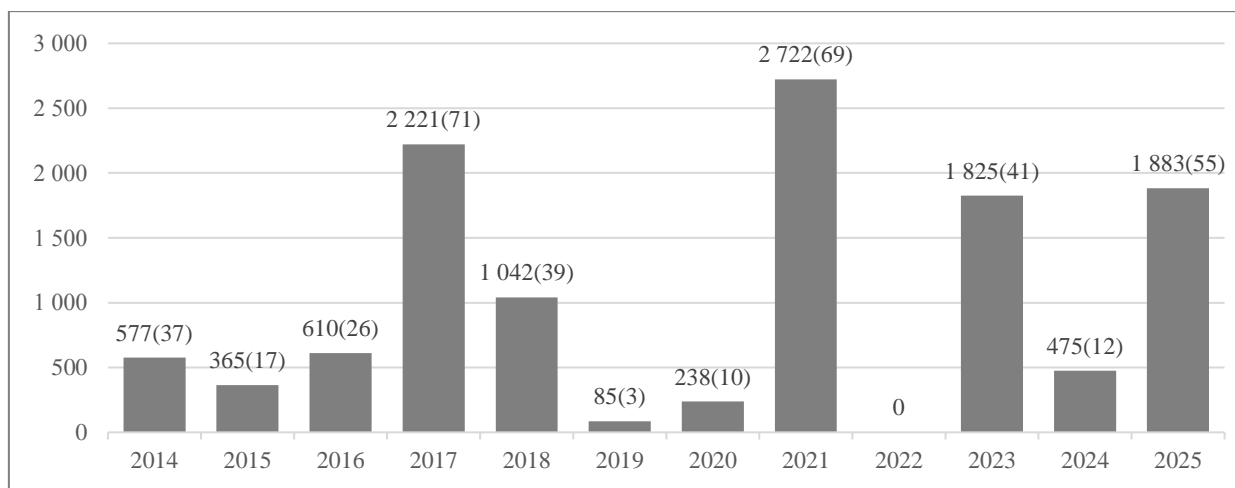

Среди отобранных объектов генерации:

- 198 объектов ветровой генерации общей установленной мощностью 7 355,5 МВт;
- 203 объекта солнечной генерации общей установленной мощностью 4 875,8 МВт;
- 18 объектов гидрогенерации общей установленной мощностью 314,7 МВт.


С учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ, а также учитывая изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ, общее количество объектов, планируемых к вводу в 2014-2031 гг., уменьшилось с 419 до 390 единиц, общая установленная мощность снизилась с 12 545,9 МВт до 11 636,4 МВт.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

План ввода на 2025 г. составил 16 объектов генерации ВИЭ общей установленной мощностью 583,4 МВт.

В 2025 г. введено 16 объектов ДПМ ВИЭ общей установленной мощностью 725,2 МВт, с учетом вводов объектов генерации, запланированных к вводу в предыдущие периоды. План 2025 г. выполнен на 124,3%.

Рис. 2 «Плановые и фактические показатели ввода мощности (с учетом переноса даты начала поставки мощности, изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ и изменений, связанных с лишением права участия по ГТП ДПМ ВИЭ и отказом от поставки мощности), МВт».

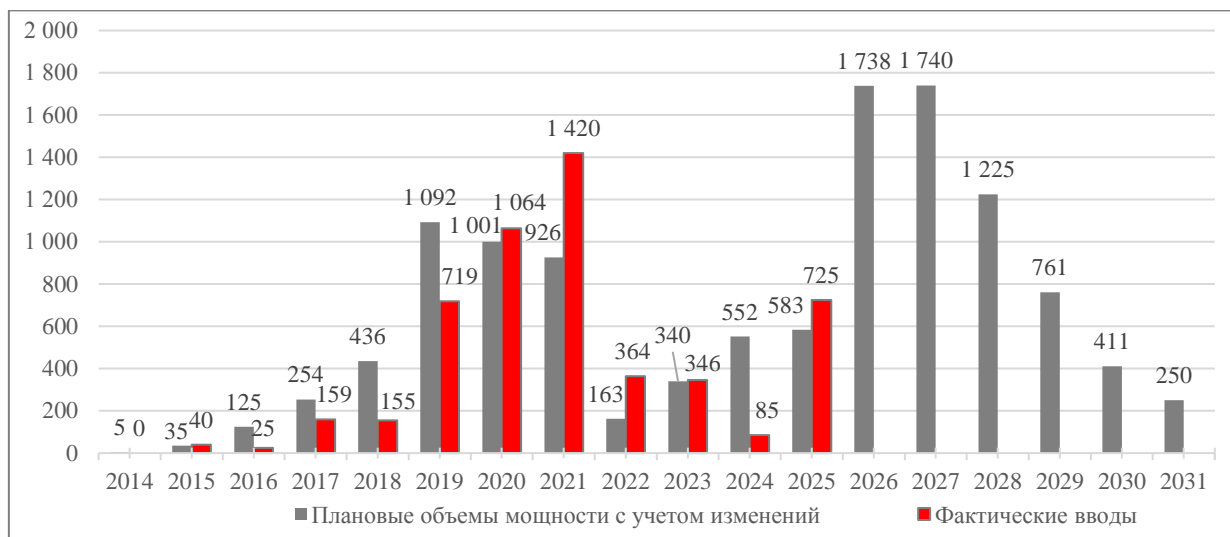

В период с 2014 г. по 2025 г. включительно введено 218 объектов генерации общей установленной мощностью 5 101,4 МВт при плане ввода 230 объектов генерации установленной мощностью 5 511,3 МВт (с учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ, отказом от поставки мощности, а также учитывая изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ). Исполнение плана составляет 92,6%.

В 4 квартале 2025 г. было принято ПП РФ от 31.10.2025 № 1704, согласно которому поставщики мощности по ДПМ ВИЭ/ДПМ ТБО, в течение 180 р.д. со дня вступления в силу ПП РФ, могут воспользоваться правом на изменение дат начала и (или) окончания поставки мощности, а также отказом от поставки мощности по ДПМ ВИЭ, заключенным в отношении объектов, включенных Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики в перечень генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых принято решение о целесообразности переноса сроков поставки мощности и (или) о целесообразности предоставления поставщикам мощности права отказа от исполнения ДПМ ВИЭ.

В 4 квартале 2025 г. были внесены изменения в даты начала и (или) окончания поставки мощности:

- на более ранние по 2 объектам генерации общей установленной мощностью 29,1 МВт;
- на более поздние по 36 объектам генерации общей установленной мощностью 1 433,682 МВт;

- были получены Уведомления от поставщиков мощности по ДПМ ВИЭ/ДПМ ТБО об изменении даты окончания поставки мощности по 19 объектам ВИЭ/ТБО общей установленной мощностью 860,203 МВт (15 объектов ВИЭ, 4 объекта ТБО). Внесены изменения в ДПМ ВИЭ по 5 объектам общей установленной мощностью 216,8 МВт (по итогам аттестации 01.12.2025 г.);
- по 7 объектам ВИЭ общей установленной мощностью 228,5 МВт был осуществлен отказ от поставки мощности.

В 2025 г.:

- осуществлены функции по изменению месторасположения 19 объектов генерации ВИЭ общей установленной мощностью 728,246 МВт;
- осуществлены изменения величины установленной мощности по 11 объектам генерации ВИЭ общей установленной мощностью 465,903 МВт;
- осуществлена передача прав и обязанностей продавца по ДПМ ВИЭ новому продавцу по 3 объектам генерации общей установленной мощностью 48,489 МВт.

II. ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

За нарушение сроков начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ в 2015 – 4 квартале 2025 гг. было рассчитано 13 251,0 млн. рублей и списано 13 250,9 млн. рублей штрафов (уровень оплаты более 99,99%).

В 4 квартале 2025 г. было рассчитано 289,7 млн. рублей штрафов (что составляет 2,2% от общего объема рассчитанных штрафов) и списано 289,7 млн. рублей штрафов (что составляет более 100% от рассчитанных в 4 квартале штрафов).

ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ) ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Особенности проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления (далее – ТБО), установлены Правилами оптового рынка.

По итогам ОПТБО, проведенного в 2017 г., отобрано 5 объектов ДПМ ТБО, суммарный объем установленной мощности которых составил 335 МВт. С учетом внесенных изменений в сроки начала и окончания поставки мощности по 5 объектам ДПМ ТБО даты поставки перенесены с 01.12.2022 г. на 01.12.2024 г.

В 2025 г. введен 1 объект генерации установленной мощностью 70 МВт, что составляет 20,9% исполнения плана за период с 01.12.2024 г. по 31.12.2025 г. включительно.
