

ОТЧЕТ

о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 2 квартала 2025 года.

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущены отборы проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций. Заключение и сопровождение договоров на модернизацию осуществляется АО «ЦФР» на основании выполнения функции Поверенного по договорам коммерческого представительства.

По итогам отборов было отобрано 130 объектов генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2028 годах, суммарный объем установленной мощности составил 28 792,2 МВт.

В результате изменений перечня и параметров объектов общее количество проектов сократилось до 112 объектов общей установленной мощностью 25 827,3 МВт (подробнее см. рис. 1),


в том числе:

- первая ценовая зона 77 объектов генерации установленной мощностью 20 537,4 МВт;
- вторая ценовая зона 35 объектов генерации установленной мощностью 5 289,9 МВт.

Разделение объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 75 объектов генерации установленной мощностью 19 907,4 МВт;
- уголь – 37 объектов генерации установленной мощностью 5 919,9 МВт.


Рис.1 Сравнение планового и скорректированного объема мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

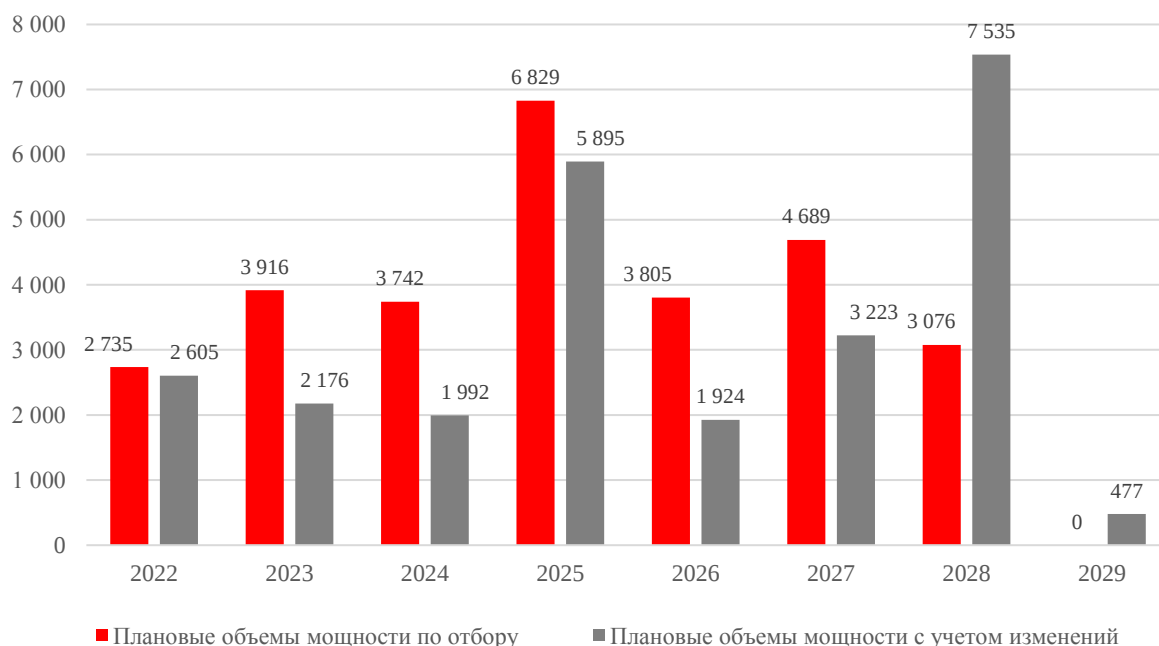

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

План вводов на 2025 год составляет 28 объектов генерации общей установленной мощностью 5 895 МВт, в том числе на 2 квартал 2025 года – 5 объектов генерации общей установленной мощностью 785 МВт. Из запланированных на 2 квартал 2025 года введен 1 объект генерации установленной мощностью 100 МВт. Дополнительно во 2 квартале введено 2 объекта генерации общей установленной мощностью 890 МВт, запланированные на 1 квартал 2025 года. Всего во 2 квартале введены 3 объекта генерации общей установленной мощностью 990 МВт. Таким образом выполнение плана 2 квартала составило 126,1%. Исполнение плана 1 полугодия 2025 года составляет 69,4%.

Рис. 2 Плановый (с учетом изменений состава и параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

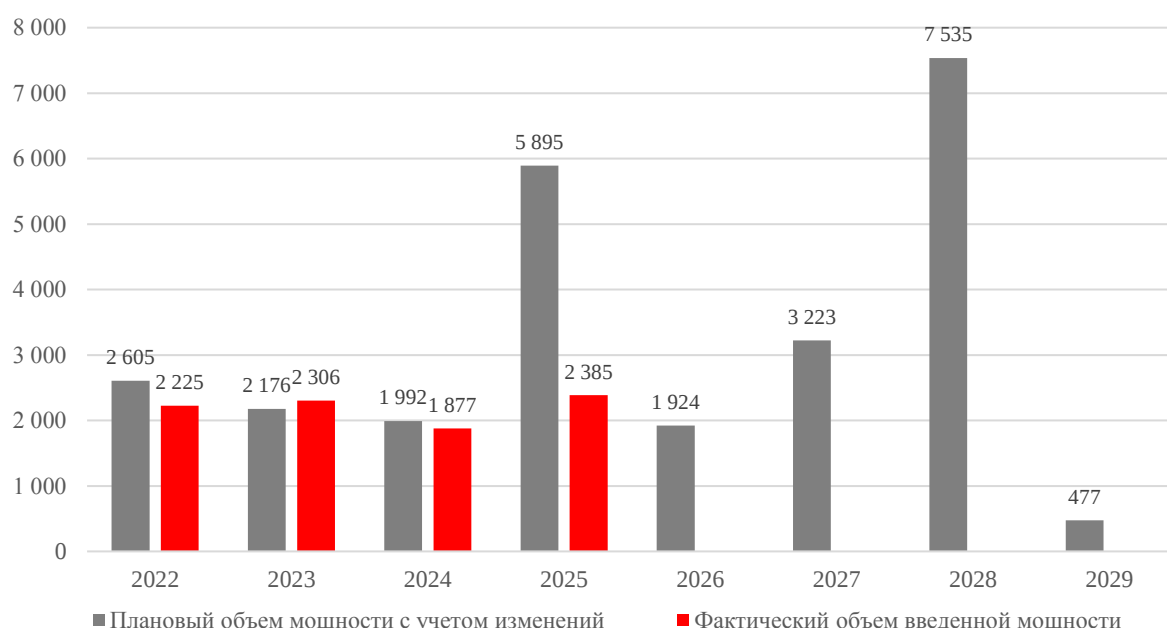

Всего по состоянию на 30.06.2025 введено 40 объектов генерации общей установленной мощностью 8 793,2 МВт, при плане в 51 объект генерации общей установленной мощностью 10 212,2 МВт. Исполнение плана составляет 86,1%.

По состоянию на 30.06.2025 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 34%, при общем плане ввода 112 объектов генерации суммарной установленной мощностью 25 827,3 МВт.

По состоянию на 30.06.2025 даты начала поставки мощности нарушили 8 компаний по 11 объектам генерации, общей мощностью 1 419 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 2 до 15 месяцев.

По состоянию на 30.06.2025 на стадии модернизации находится 29 объектов генерации общей установленной мощностью 4 830 МВт, в т.ч.:

- 18 объектов генерации общей установленной мощностью 3 411 МВт с плановым периодом модернизации;
- 11 объектов генерации общей установленной мощностью 1 419 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Изменения параметров договоров во 2 квартале 2025 года:

- По инициативе участника во 2 квартале 2025 года изменены даты начала и окончания поставки мощности в связи с уменьшением периода модернизации по 2 объектам генерации общей установленной мощностью 220 МВт;
- Учтены изменения в соответствии с распоряжением Правительства №1390-р от 29.05.2025. Изменены даты начала периода реализации проекта, начала и окончания поставки мощности на более поздние по 13 объектам генерации общей установленной мощностью 5 609,9 МВт;
- В соответствии с распоряжением Правительства №1390-р от 29.05.2025 исключены 2 объекта генерации общей установленной мощностью 220 МВт. С 01.06.2025 расторгнуты договоры КОММод.

III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

Штрафов по КОММод во 2 квартале 2025 года было рассчитано и списано 14,3 млн. рублей (что составляет 0,2% от общего объема рассчитанных штрафов). В период с 2022 – 2 квартал 2025 гг. было рассчитано и списано 6 355,6 млн. рублей (уровень оплаты – 99,999%). Уровень расчетов менее 100% обусловлен задолженностью перед ООО "Тверская генерация" (банкрот в конкурсном производстве), расчеты с которым производятся вне УКО.
