

ОТЧЕТ

о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 2025 года.

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущены отборы проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций. Заключение и сопровождение договоров на модернизацию осуществляется АО «ЦФР» на основании выполнения функции Поверенного по договорам коммерческого представительства.

По итогам отборов было отобрано 130 объектов генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2028 годах, суммарный объем установленной мощности составил 28 792,2 МВт.

В результате изменений перечня и параметров объектов общее количество проектов сократилось до 112 объектов общей установленной мощностью 25 827,3 МВт (подробнее см. рис. 1),


в том числе:

- первая ценовая зона 77 объектов генерации установленной мощностью 20 537,4 МВт;
- вторая ценовая зона 35 объектов генерации установленной мощностью 5 289,9 МВт.

Разделение объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 75 объектов генерации установленной мощностью 19 907,4 МВт;
- уголь – 37 объектов генерации установленной мощностью 5 919,9 МВт.


Рис.1 Сравнение планового и скорректированного объема мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

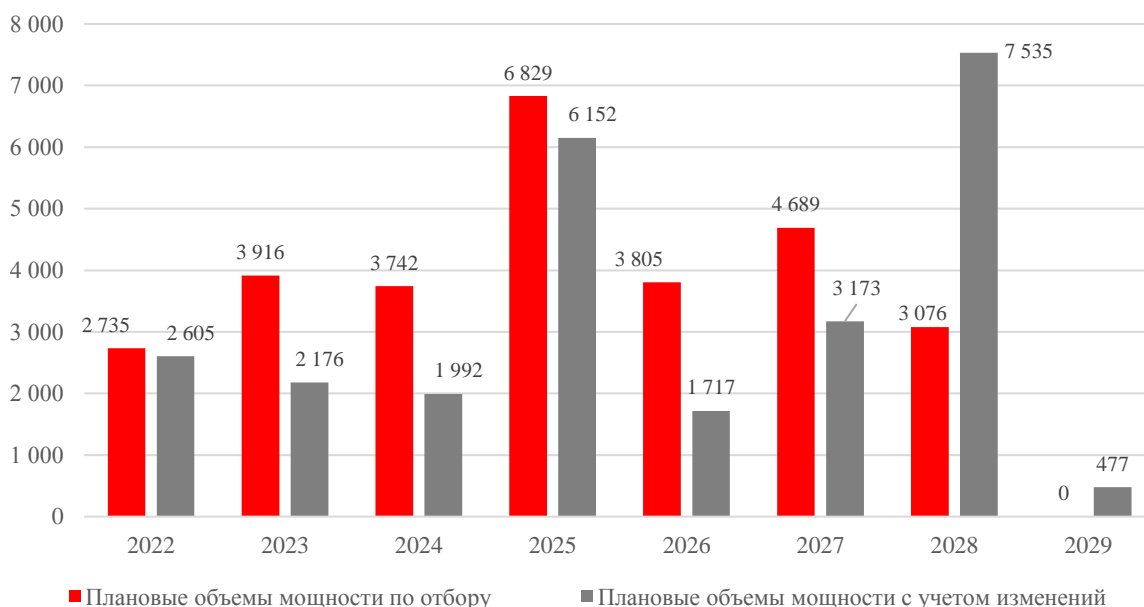

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

План вводов на 2025 год составляет 29 объектов генерации общей установленной мощностью 6 828,9 МВт. Из запланированных на 2025 год введены 13 объектов генерации общей установленной мощностью 3 180 МВт. Дополнительно в 2025 году введены 2 объекта общей установленной мощностью 315 МВт, запланированные к вводу в 2024 году. Таким образом в 2025 году введены 15 объектов общей установленной мощностью 3 495 МВт. Исполнение плана 2025 года составляет 56,81%.

Рис. 2 Плановый (с учетом изменений состава и параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

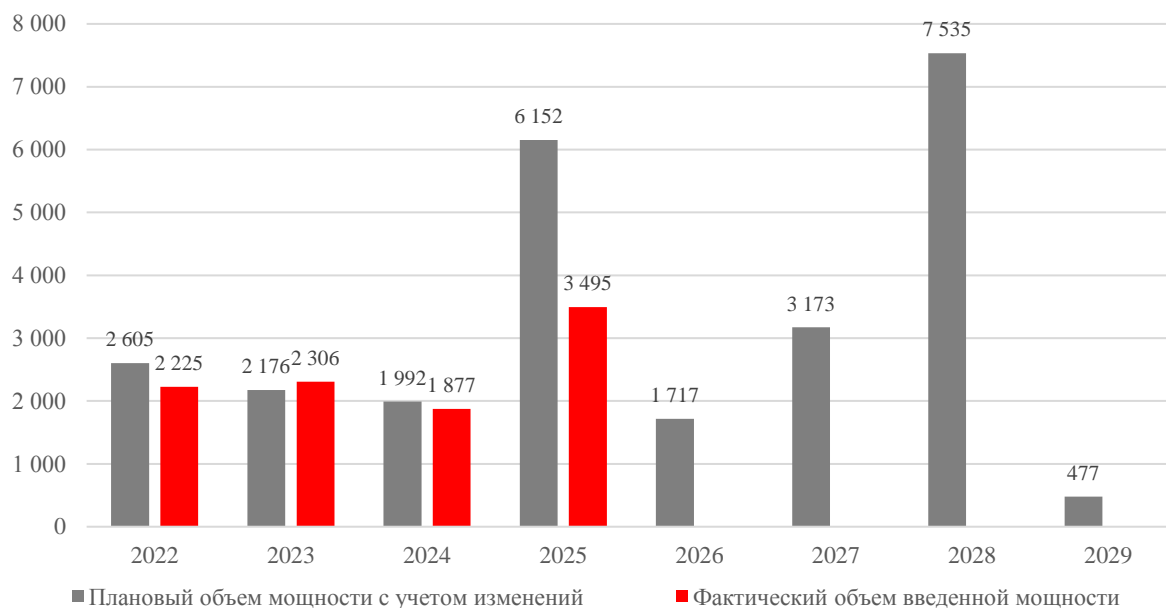

Всего по состоянию на 31.12.2025 введено 46 объектов генерации общей установленной мощностью 9 903,2 МВт, при плане в 63 объекта общей установленной мощностью 12 925,2 МВт. Исполнение плана составляет 76,62%.

По состоянию на 31.12.2025 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 38,34%, при общем плане ввода 112 объектов генерации суммарной установленной мощностью 25 827,3 МВт.

По состоянию на 31.12.2025 даты начала поставки мощности нарушили 13 компаний по 17 объектам генерации, общей мощностью 3 022 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 1 до 21 месяца.

На стадии модернизации находится 30 объекта генерации общей установленной мощностью 4 534,8 МВт, в т.ч.:

- 13 объектов генерации общей установленной мощностью 1 512,8 МВт с плановым периодом модернизации;
- 17 объектов генерации общей установленной мощностью 3 022 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Основные изменения параметров договоров в 2025 году:

- По инициативе участника в 2025 году изменены даты начала и окончания поставки мощности в связи с уменьшением периода модернизации по 6 объектам генерации установленной мощностью 931,9 МВт и даты окончания поставки мощности по 3 объектам генерации общей установленной мощностью 286,4 МВт;
- В 2025 году учтены изменения в соответствии с распоряжениями Правительства №482-р от 28.02.2025 и №1390-р от 29.05.2025 - изменены даты начала периода реализации проекта, начала и окончания поставки мощности на более поздние по 19 объектам генерации общей установленной мощностью 7 339,9 МВт. А также в соответствии с распоряжениями Правительства №318-р от 13.02.2025 и №1390-р от 29.05.2025 исключено 17 объектов генерации общей установленной мощностью 2 114,9 МВт.

III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

В 2025 году было рассчитано 6 114,7 млн. рублей штрафов по КОММод, списано 6 114,6 млн. рублей (более 95% всех рассчитанных и списанных штрафов). В том числе в 4 квартале 2025 г. было рассчитано и списано 20,8 млн. рублей (что составляет 0,3% от общего объема рассчитанных штрафов). В период с 2022 – 4 квартал 2025 г. было рассчитано и списано 6 397,22 млн. рублей (уровень оплаты – 99,999%).
