

## ОТЧЕТ

### о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 1 квартала 2025 года.

#### I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущены отборы проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций. Заключение и сопровождение договоров на модернизацию осуществляется АО «ЦФР» на основании выполнения функции Поверенного по договорам коммерческого представительства.

По итогам отборов было отобрано 130 объектов генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2028 годах, суммарный объем установленной мощности составил 28 792,2 МВт

В результате изменений перечня и параметров объектов общее количество проектов сократилось до 114 объектов общей установленной мощностью 26 047,3 МВт (подробнее см. рис. 1),


в том числе:

- первая ценовая зона 79 объектов генерации установленной мощностью 20 757,4 МВт;
- вторая ценовая зона 35 объектов генерации установленной мощностью 5 289,9 МВт.

Разделение объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 77 объектов генерации установленной мощностью 20 127,4 МВт;
- уголь – 37 объектов генерации установленной мощностью 5 919,9 МВт.


**Рис. 1 Сравнение планового и скорректированного объема мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.**

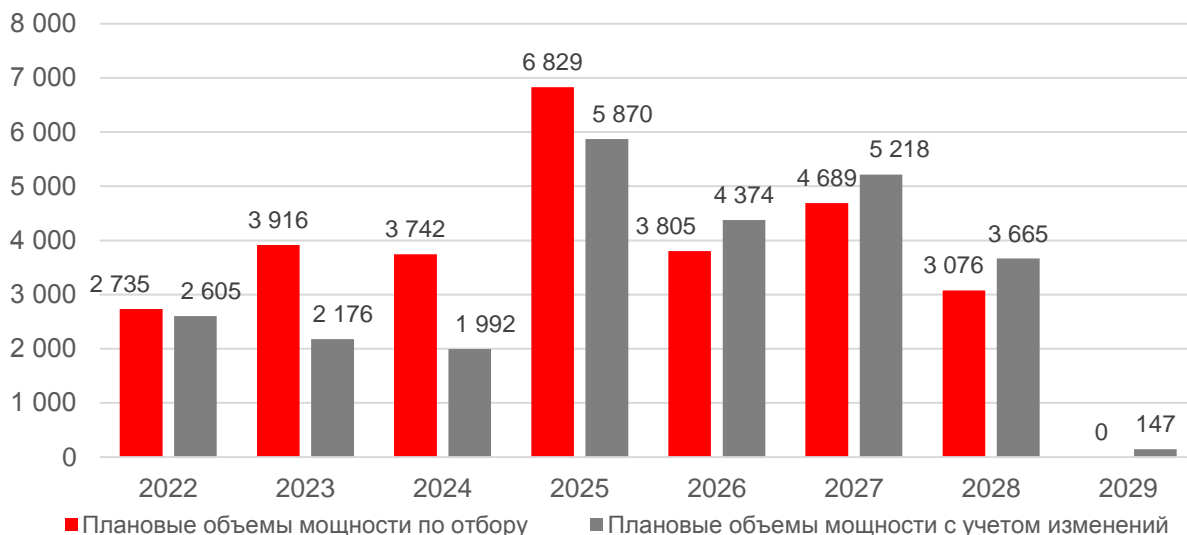

## II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

План вводов на 2025 год составляет 28 объектов генерации общей установленной мощностью 5 870 МВт, в том числе на 1 квартал 2025 года – 12 объектов генерации общей установленной мощностью 2 654 МВт. Из запланированных на 1 квартал 2025 года введены 5 объектов генерации установленной мощностью 1 265 МВт. Дополнительно в 2025 году введен 1 объект установленной мощностью 130 МВт, запланированный к вводу в 2024 году. Таким образом в 2025 году введены 6 объектов общей установленной мощностью 1 395 МВт. Исполнение плана 1 квартала 2025 года составляет 52,6%

**Рис. 2 Плановый (с учетом изменений состава и параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.**

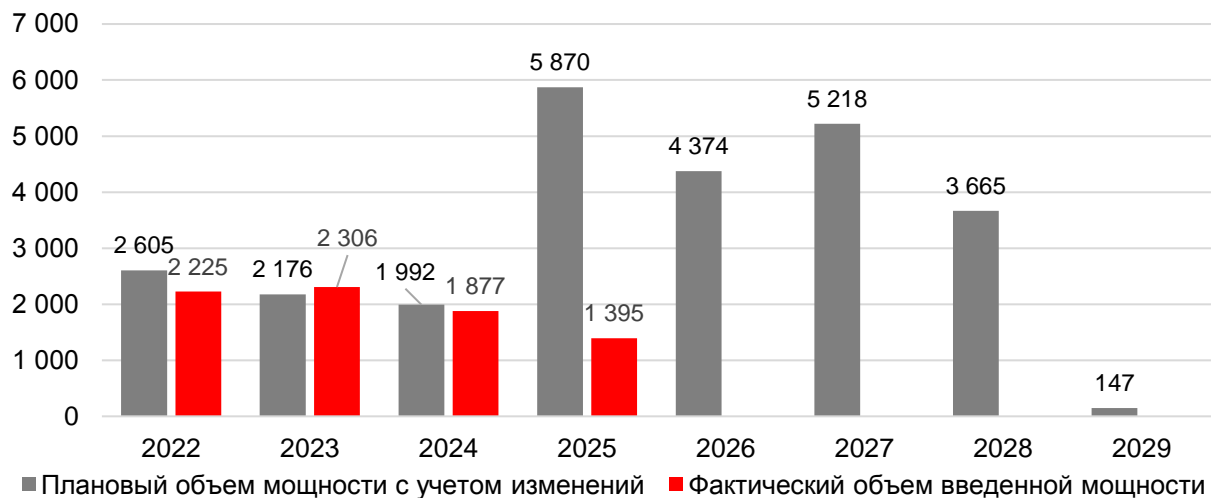

Всего по состоянию на 31.03.2025 введено 37 объектов генерации общей установленной мощностью 7 803,2 МВт, при плане в 46 объектов генерации общей установленной мощностью 9 427,2 МВт. Исполнение плана составляет 82,8%.

По состоянию на 31.03.2025 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 29,96%, при общем плане ввода 114 объектов генерации суммарной установленной мощностью 26 047,3 МВт.

По состоянию на 31.03.2025 даты начала поставки мощности нарушили 8 компании по 9 объектам генерации, общей мощностью 1 624 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 1 до 12 месяцев.

По состоянию на 31.03.2025 на стадии модернизации находится 32 объекта общей установленной мощностью 5 080 МВт, в том числе:

- 23 объекта общей установленной мощностью 3 456 МВт с плановым периодом модернизации;
- 9 объектов установленной мощностью 1 624 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Изменения параметров договоров в 1 квартале 2025 года:

- По инициативе участника в 1 квартале 2025 года изменена дата окончания поставки мощности в связи с уменьшением периода поставки по 1 объекту генерации установленной мощностью 116,4 МВт, изменены даты начала и окончания поставки мощности (с уменьшением периода модернизации) по 2 объектам генерации общей установленной мощностью 405 МВт;

- Учтены изменения в соответствии с распоряжением Правительства №482-р от 28.02.2025. Изменены даты начала периода реализации проекта, начала и окончания поставки мощности на более поздние по 6 объектам генерации общей установленной мощностью 1 730 МВт;
- В соответствии с распоряжением Правительства №261-р от 07.02.2025 учтен отбор объектов генерации КОММод – отобрано 3 объекта генерации установленной мощностью 1 960 МВт;
- В соответствии с распоряжением Правительства №318-р от 13.02.2025 учтено исключение 15 объектов генерации. С 01.03.2025 расторгнуты договоры КОММод.

### III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

Штрафов по КОММод в 1 квартале 2025 г. было рассчитано 6 058,74 млн. рублей (что составляет 95,5% от общего объема рассчитанных штрафов) и списано 6 058,70 млн. рублей. Недоплата обусловлена задолженностью перед генератором-банкротом в конкурсном производстве, расчеты с которым осуществляются вне уполномоченной кредитной организации. За период с 2022 – 1 квартал 2025 гг. было рассчитано 6 341,31 млн. рублей и списано 6 341,27 млн. рублей штрафов (уровень оплаты – 99,999%).
