

ОТЧЕТ

о ходе реализации отобранных инвестиционных проектов участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО (за 3 квартал 2024 г.)

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Правила оптового рынка), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172 Коммерческим оператором начиная с 2013 г. проводятся конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – ОПВ).


ОПВ проводится на 4 года вперед отдельно для каждого вида генерирующих объектов, функционирующих на основе использования разных видов возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ):

- фотоэлектрического преобразования энергии солнца (объект солнечной генерации);
- энергии ветра (объект ветровой генерации);
- энергии потоков воды (в том числе энергии сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электростанциях (генерирующий объект гидрогенерации).

Целевые показатели величин объемов ввода объектов ВИЭ и предельные величины капитальных затрат, используемые в целях проведения ОПВ, определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р.

Всего по итогам ОПВ, проведенным в 2013 - 2021, 2023 гг., отобрано 352 объекта ДПМ ВИЭ с датой начала поставки мощности 2014-2029 гг., суммарный объем установленной мощности составил 10 188,2 МВт. (подробнее см. рис.1).

Рис. 1 «Итоги ОПВ за 2013 – 2021, 2023 гг., МВт (количество объектов)».

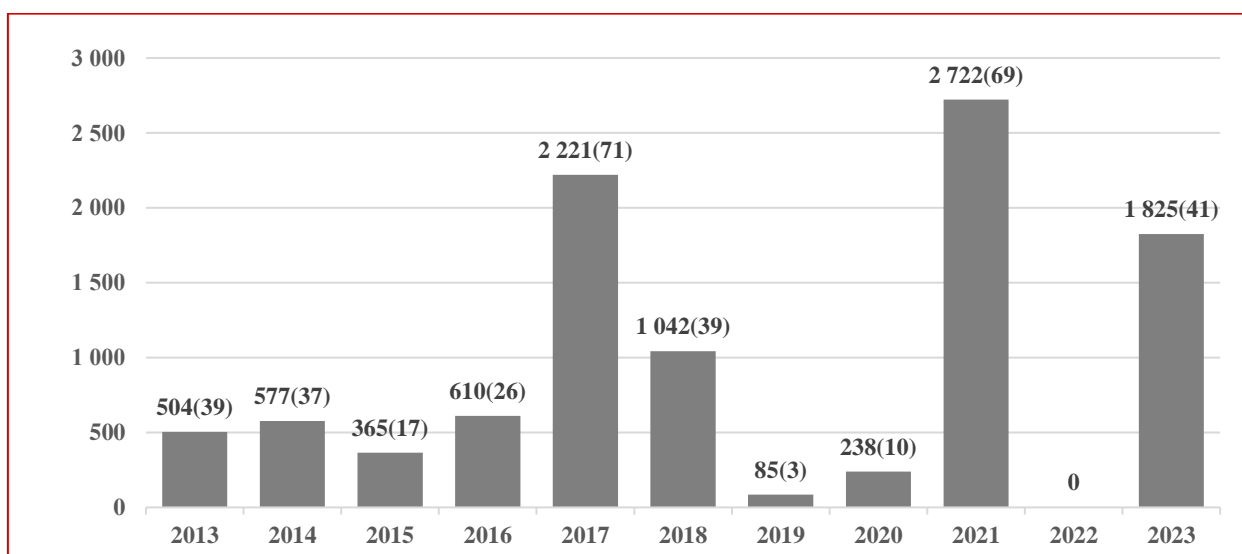

Среди отобранных объектов генерации:


- 177 объектов ветровой генерации общей установленной мощностью 6 158,9 МВт;
- 158 объектов солнечной генерации общей установленной мощностью 3 719,6 МВт;
- 17 объектов гидрогенерации общей установленной мощностью 309,7 МВт.

С учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ, а также учитывая изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ, по состоянию на 30.09.2024 г. общее количество объектов, планируемых к вводу в 2014 - 2029 гг., уменьшилось с 352 до 330 единиц, общая установленная мощность снизилась с 10 188,2 МВт до 9 508,1 МВт.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

На 2024 г. запланирован ввод 12 объектов генерации установленной мощностью 551,7 МВт в 7 субъектах РФ. Из них в 3 квартале 2024 г. запланирован ввод 5 объектов генерации установленной мощностью 293,6 МВт. Ввода объектов в 3 квартале 2024 г. не осуществлялось.

Рис. 2 «Плановые и фактические показатели ввода мощности (с учетом переноса даты начала поставки мощности, изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ и изменений, связанных с лишением права участия по ГТП ДПМ ВИЭ), МВт».

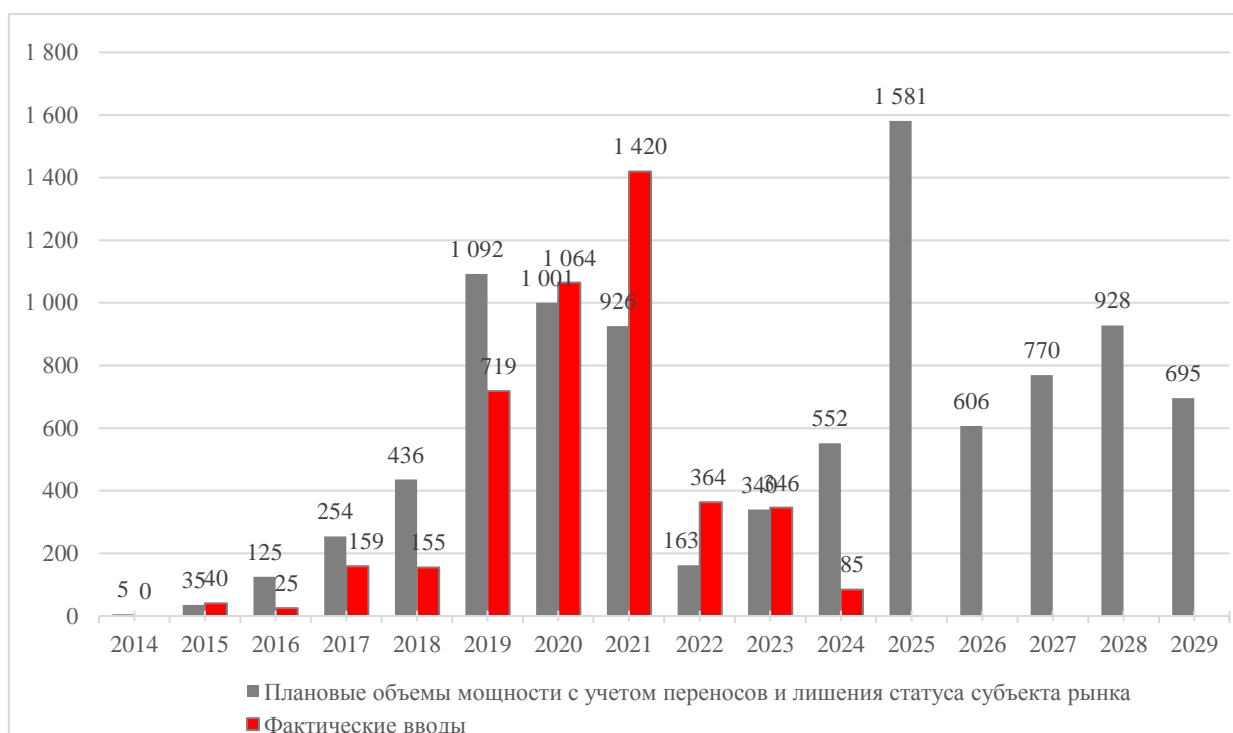

В период с 2014 г. по 3 квартал 2024 г. включительно введено 202 объекта генерации установленной мощностью 4 376,2 МВт при плане ввода 207 объектов генерации установленной мощностью 4 669,8 МВт (с учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ, а также учитывая изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ). Исполнение плана составляет 93,7%.

В 3 квартале 2024 г.:

- осуществлена передача прав и обязанностей продавца по ДПМ ВИЭ новому продавцу 2 компаниями по 23 объектам генерации общей установленной мощностью 896,05 МВт.

II. ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

Штрафов по ДПМ ВИЭ в 2015 – 3 квартале 2024 г. было рассчитано 11 586,7 млн. рублей и оплачено / прекращено / прекращен учета обязательств 11 586,6 млн. рублей штрафов (уровень оплаты более 99,99%).

В 3 квартале 2024 г. было рассчитано 35,2 млн. рублей штрафов и оплачено и прекращено обязательств 186,8 млн. рублей штрафов (что составляет 530,4% от рассчитанных в 3 квартале штрафов), из которых прекращены обязательства по оплате штрафов на сумму 151,6 млн. рублей в связи с прекращением деятельности юридического лица.

ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ) ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Особенности проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления (далее – ТБО), установлены Правилами оптового рынка.

В 3 квартале 2024 г. изменений по объектам ДПМ ТБО не осуществлялось.
