

## ОТЧЕТ

### о ходе реализации отобранных инвестиционных проектов участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО (за 1 квартал 2021 года)

#### I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Правила оптового рынка), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172 Коммерческим оператором ежегодно начиная с 2013 г. проводятся конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – ОПВ).


ОПВ проводится на 4 года вперед отдельно для каждого вида генерирующих объектов, функционирующих на основе использования разных видов возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ):

- фотоэлектрического преобразования энергии солнца (объект солнечной генерации);
- энергии ветра (объект ветровой генерации);
- энергии потоков воды (в том числе энергии сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электростанциях (генерирующий объект гидрогенерации).

Целевые показатели величин объемов ввода объектов ВИЭ и предельные величины капитальных затрат, используемые в целях проведения ОПВ, определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р.

По итогам ОПВ, проведенных в 2013-2020 гг., отобрано 242 объекта ДПМ ВИЭ с датой начала поставки мощности в 2014-2024 гг., суммарный объем установленной мощности отобранных объектов составил 5 641 МВт. (подробнее см. рис. 1).

Рис. 1 «Итоги ОПВ за 2013-2020 гг., МВт (количество объектов)»

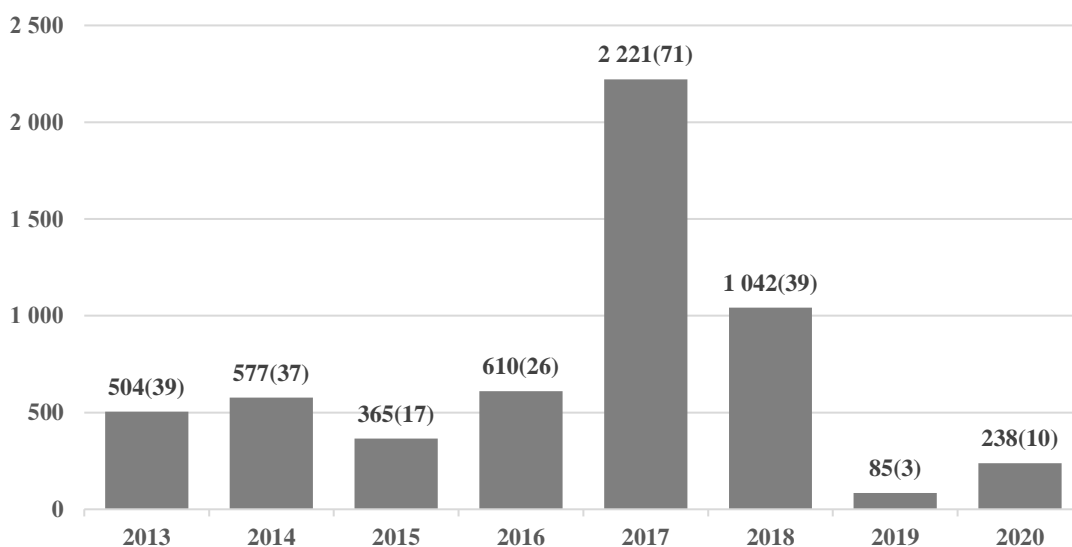

Среди отобранных объектов генерации:

- 112 объектов ветровой генерации общей установленной мощностью 3 569 МВт;
- 116 объектов солнечной генерации общей установленной мощностью 1 858 МВт;
- 14 объектов гидрогенерации общей установленной мощностью 214 МВт.

С учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ, общее количество объектов, планируемых к вводу в 2014-2024 гг., уменьшилось с 242 до 233 единиц, общая установленная мощность снизилась с 5 641 МВт до 5 430 МВт.


## II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

В период с 2014 г. по 1 квартал 2021 г. включительно введено 132 объекта генерации установленной мощностью 2 492,14 МВт, при плане ввода 151 объект генерации установленной мощностью 2 948 МВт (с учетом изменений, связанных с прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ). Исполнение плана составляет 84,5%.

На 2021 г. запланирован ввод 27 объектов генерации установленной мощностью 940,67 МВт.

В 1 квартале 2021 г. ввода объектов генерации запланировано не было, но фактически введено 18 объектов генерации установленной мощностью 330,04 МВт, запланированные к вводу в предыдущие периоды (подробнее см. рис.2).

Рис. 2 «Плановые и фактические показатели ввода мощности в 2014-2024 гг. в МВт»<sup>1</sup>.

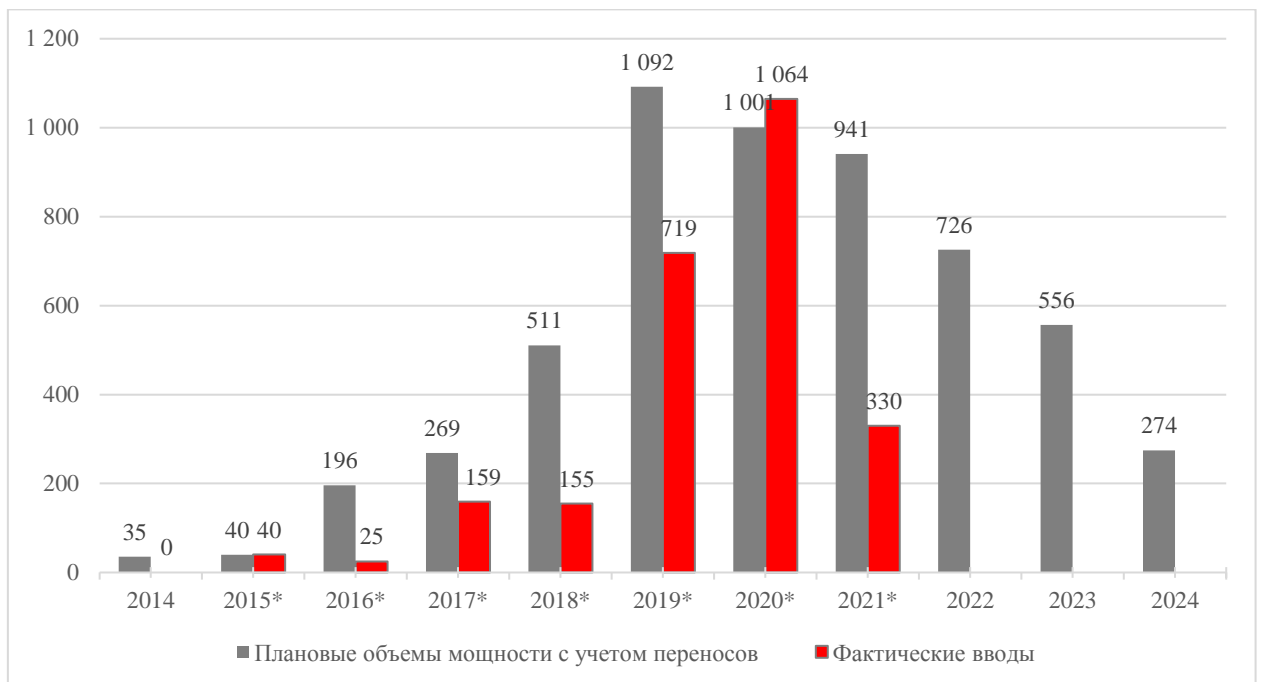

\*- С учетом ввода объектов генерации, запланированных к вводу в предыдущие годы

По состоянию на 31.03.2021 г. даты начала поставки мощности нарушили 4 компании по 19 объектам генерации, общей мощностью 455,89 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 4 до 11 месяцев.

<sup>1</sup> В плановых показателях объема мощности на рис.2 не отражены изменения, связанные с прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ.

В 1 квартале 2021г.:

- изменений дат начала поставки мощности и месторасположений не осуществлялось;
- передача прав и обязанностей продавца по ДПМ ВИЭ новому продавцу осуществлялась по 2 компаниям по 3 объектам общей установленной мощностью 65 МВт.

### III. ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

За нарушение сроков начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ в 2015 – 1 кв. 2021 гг. было рассчитано 9 168,2 млн. рублей и списано 8 916,6 млн. рублей штрафов (уровень оплаты – 97,3%). В 1 кв. 2021 г. было рассчитано 885,1 млн. рублей штрафов (что составляет 9,7 % от общего объема рассчитанных штрафов) и списано 930,9 млн. рублей штрафов (что составляет 105,2% от рассчитанных в 1 квартале штрафов).

### ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ) ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Особенности проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления (далее – ОПТБО), установлены Правилами оптового рынка.

По итогам ОПТБО, проведенного в 2017 г., отобрано 5 объектов ДПМ ТБО с плановой датой начала поставки в 2022 году, суммарный объем установленной мощности которых составляет 335 МВт.

По информации, полученной от АО «АТС» 17.07.2018 г., в связи с отсутствием заявок по результатам конкурсного отбора в 2018 г. не было отобрано ни одного проекта.

В 1 квартале 2021 г. не поступали основания для изменения информации по ОПТБО.
