

ОТЧЕТ

о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 2 квартала 2024 года.

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущены отборы проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций. Заключение и сопровождение договоров на модернизацию осуществляется АО «ЦФР» на основании выполнения функции Поверенного по договорам коммерческого представительства.


По итогам отборов было отобрано 127 объектов генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2028 годах, суммарный объем установленной мощности составил 26 832,2 МВт (подробнее см. рис.1), в том числе:

- первая ценовая зона 89 объектов генерации установленной мощностью 21 767,3 МВт;
- вторая ценовая зона 38 объектов генерации установленной мощностью 5 064,9 МВт.

Разделение отобранных объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 87 объектов генерации установленной мощностью 21 137,3 МВт;
- уголь – 40 объектов генерации установленной мощностью 5 694,9 МВт.

Рис. 1 Плановый объем мощности модернизируемых объектов генерации по результатам отборов, МВт.

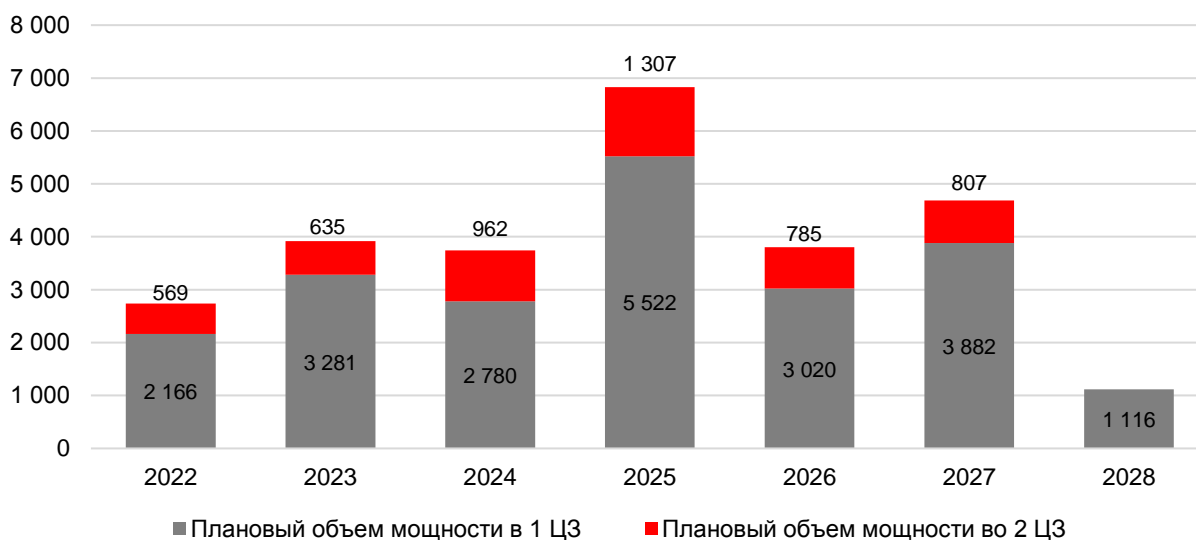

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

План вводов на 2024 год составил 13 объектов генерации общей установленной мощностью 2 062 МВт, в том числе 1 объект установленной мощностью 50 МВт был запланирован к вводу на 2 квартал. Во 2 квартале вводы не производились. Таким образом исполнение плана 1 полугодия 2024 составляет 96,4%.

Рис. 2 Плановый (с учетом изменения периодов модернизации и поставки мощности, а также параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.



Всего за весь период до 30.06.2024 введено 26 объектов генерации установленной мощностью 5 868,4 МВт, при плане в 29 объектов генерации установленной мощностью 6 168,2 МВт. Исполнение плана составляет 95,1%.

По состоянию на 30.06.2024 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 21,9%, при общем плане ввода 127 объектов генерации суммарной установленной мощностью 26 832,2 МВт.

По состоянию на 30.06.2024 даты начала поставки мощности нарушили 2 компании по 3 объектам генерации, установленной мощностью 299,8 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 3 до 21 месяцев.

По состоянию на конец отчетного периода на стадии модернизации находится 27 объектов с установленной мощностью 4 835,7 МВт, в том числе:

- 24 объектов установленной мощностью 4 535,9 МВт с плановым периодом модернизации;
- 3 объекта установленной мощностью 299,8 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Изменения параметров договоров во 2 квартале 2024 года:

- по инициативе участника изменения дат начала периода реализации проекта, начала и окончания поставки мощности оформлены по 4 объектам генерации общей установленной мощностью 485 МВт;
- по инициативе АО «СО ЕЭС» изменены даты начала периода реализации проекта, начала и окончания поставки мощности по 1 объекту генерации установленной мощностью 80 МВт.

III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

Штрафов по КОММод во 2 квартале 2024 г. было рассчитано и списано 42,9 млн. рублей (что составляет 19,5% от общего объема рассчитанных штрафов). В период с 2022 – 2 квартал 2024 гг. было рассчитано и списано 220,1 млн. рублей (уровень оплаты – 100%).
