

## ОТЧЕТ

### о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 3 квартала 2024 года.

#### I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущены отборы проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций. Заключение и сопровождение договоров на модернизацию осуществляется АО «ЦФР» на основании выполнения функции Поверенного по договорам коммерческого представительства.


По итогам отборов было отобрано 127 объектов генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2028 годах, суммарный объем установленной мощности составил 26 832,2 МВт (подробнее см. рис.1), в том числе:

- первая ценовая зона 89 объектов генерации установленной мощностью 21 767,3 МВт;
- вторая ценовая зона 38 объектов генерации установленной мощностью 5 064,9 МВт.

Разделение отобранных объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 87 объектов генерации установленной мощностью 21 137,3 МВт;
- уголь – 40 объектов генерации установленной мощностью 5 694,9 МВт.

**Рис. 1 Плановый объем мощности модернизируемых объектов генерации по результатам отборов, МВт.**

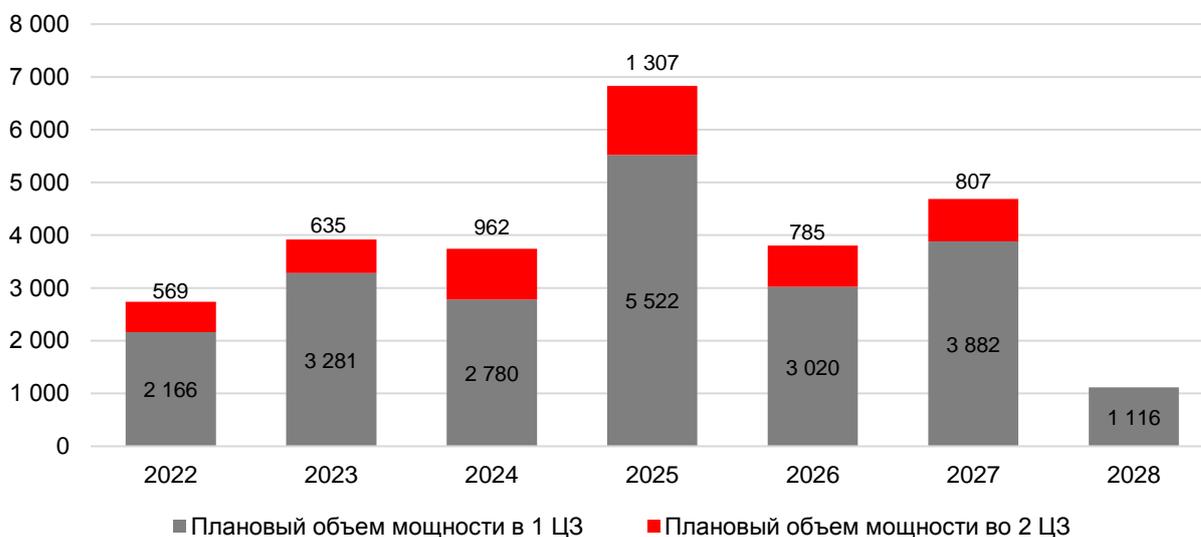

## II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

План вводов на 2024 год составляет 13 объектов генерации общей установленной мощностью 2 062 МВт, в том числе на 3 квартал был запланирован ввод 3 объектов генерации общей установленной мощностью 290 МВт. Объекты введены без задержек. Дополнительно введен 1 объект генерации установленной мощностью 124,9 МВт, запланированный к вводу в 2022 году. Исполнение плана 9 месяцев 2024 г. составляет 97%.

**Рис. 2 Плановый (с учетом изменения периодов модернизации и поставки мощности, а также параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.**



Всего по состоянию на 30.09.2024 введено 30 объектов генерации общей установленной мощностью 6 283,3 МВт, при плане в 32 объекта генерации общей установленной мощностью 6 458,2 МВт. Исполнение плана составляет 97,3%.

По состоянию на 30.09.2024 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 23,4%, при общем плане ввода 127 объектов генерации суммарной установленной мощностью 26 832,2 МВт.

По состоянию на 30.09.2024 даты начала поставки мощности нарушили 2 компании по 2 объектам генерации, общей мощностью 174,9 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 6 до 12 месяцев.

По состоянию на 30.09.2024 на стадии модернизации находится 33 объекта общей установленной мощностью 6 436,8 МВт, в том числе:

- 31 объект общей установленной мощностью 6 261,9 МВт с плановым периодом модернизации;
- 2 объекта установленной мощностью 174,9 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Изменения параметров договоров в 3 квартале 2024 года:

- по инициативе участника в 3 квартале 2024 года изменена дата окончания поставки мощности в связи с уменьшением периода поставки по 1 объекту генерации установленной мощностью 80 МВт;
- по инициативе АО «СО ЕЭС» изменены даты начала периода реализации проекта, начала и окончания поставки мощности по 1 объекту генерации установленной мощностью 150 МВт.

### III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

Штрафов по КОММод в 3 квартале 2024 года было рассчитано и списано 17,1 млн. рублей (что составляет 7,2% от общего объема рассчитанных штрафов). В период с 2022 – 3 квартал 2024 гг. было рассчитано и списано 237,2 млн. рублей (уровень оплаты – 100%).
