

ОТЧЕТ

о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 1 квартала 2024 года.

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущены отборы проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций. Заключение и сопровождение договоров на модернизацию осуществляется АО «ЦФР» на основании выполнения функции Поверенного по договорам коммерческого представительства.


По итогам отборов было отобрано 127 объектов генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2028 годах, суммарный объем установленной мощности составил 26 832,2 МВт (подробнее см. рис.1), в том числе:

- первая ценовая зона 89 объектов генерации установленной мощностью 21 767,3 МВт;
- вторая ценовая зона 38 объектов генерации установленной мощностью 5 064,9 МВт.

Разделение отобранных объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 87 объектов генерации установленной мощностью 21 137,3 МВт;
- уголь – 40 объектов генерации установленной мощностью 5 694,9 МВт.


Рис. 1 Плановый объем мощности модернизируемых объектов генерации по результатам отборов, МВт.

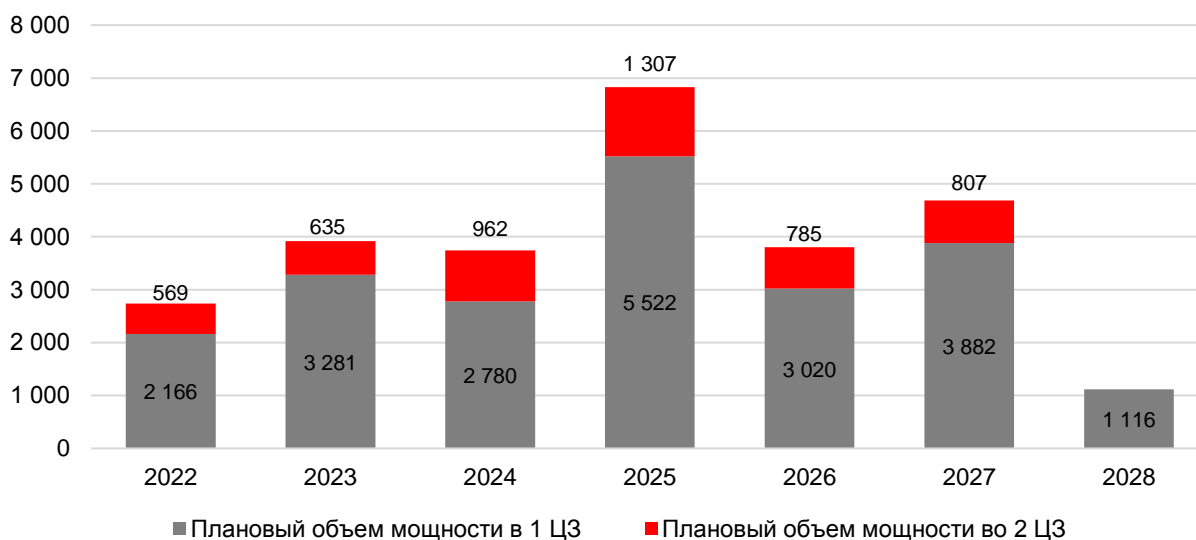

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

План вводов на 2024 год составил 11 объектов генерации общей установленной мощностью 1 882 МВт, в том числе 6 объектов генерации суммарной установленной мощностью 1 337 МВт были запланированы на 1 квартал. Из запланированных на 1 квартал 2024 года все объекты введены без задержек. Таким образом выполнение плана составляет 100%.

Рис. 2 Плановый (с учетом изменения периодов модернизации и поставки мощности, а также параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

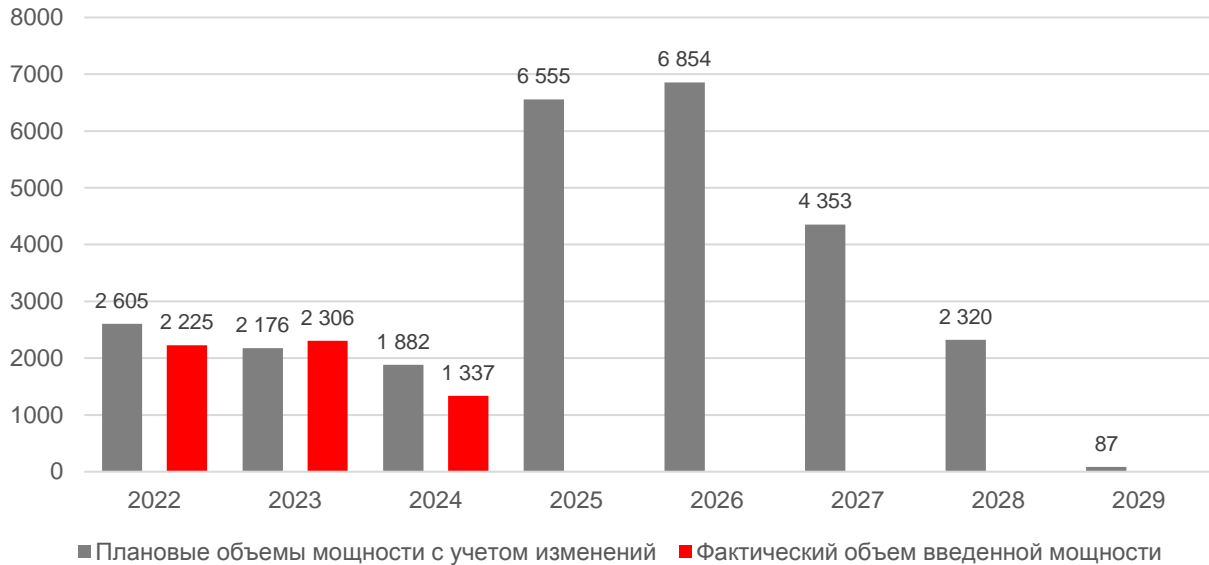

Всего за весь период до 31.03.2024 введено 26 объектов генерации установленной мощностью 5 868,4 МВт, при плане в 28 объектов генерации установленной мощностью 6 118,2 МВт. Исполнение плана составляет 95,9%.

По состоянию на 31.03.2024 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 21,9%, при общем плане ввода 127 объектов генерации суммарной установленной мощностью 26 832,2 МВт.

По состоянию на 31.03.2024 даты начала поставки мощности нарушила 1 компания по 2 объектам генерации, установленной мощностью 249,8 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 6 до 18 месяцев.

По состоянию на конец отчетного периода на стадии модернизации находится 22 объекта с установленной мощностью 4 108,8 МВт, в том числе:

- 20 объектов установленной мощностью 3 859 МВт с плановым периодом модернизации;
- 2 объекта установленной мощностью 249,8 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Изменения параметров договоров в 2024 году:

- по инициативе АО «СО ЕЭС» изменены даты начала периода реализации проекта, начала и окончания поставки мощности по 1 объекту генерации установленной мощностью 257 МВт;

III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

Штрафов по КОММод в 1 квартале 2024 года было рассчитано и списано 48,7 млн. рублей (что составляет 27,5% от общего объема рассчитанных штрафов). В период с 2022 – 1 квартал 2024 гг. было рассчитано и списано 177,2 млн. рублей (уровень оплаты – 100%).
