

ОТЧЕТ

о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 3 квартала 2025 года.

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущены отборы проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций. Заключение и сопровождение договоров на модернизацию осуществляется АО «ЦФР» на основании выполнения функции Поверенного по договорам коммерческого представительства.

По итогам отборов было отобрано 130 объектов генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2028 годах, суммарный объем установленной мощности составил 28 792,2 МВт.

В результате изменений перечня и параметров объектов общее количество проектов сократилось до 112 объектов общей установленной мощностью 25 827,3 МВт (подробнее см. рис. 1),


в том числе:

- первая ценовая зона 77 объектов генерации установленной мощностью 20 537,4 МВт;
- вторая ценовая зона 35 объектов генерации установленной мощностью 5 289,9 МВт.

Разделение объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 75 объектов генерации установленной мощностью 19 907,4 МВт;
- уголь – 37 объектов генерации установленной мощностью 5 919,9 МВт.


Рис.1 Сравнение планового и скорректированного объема мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

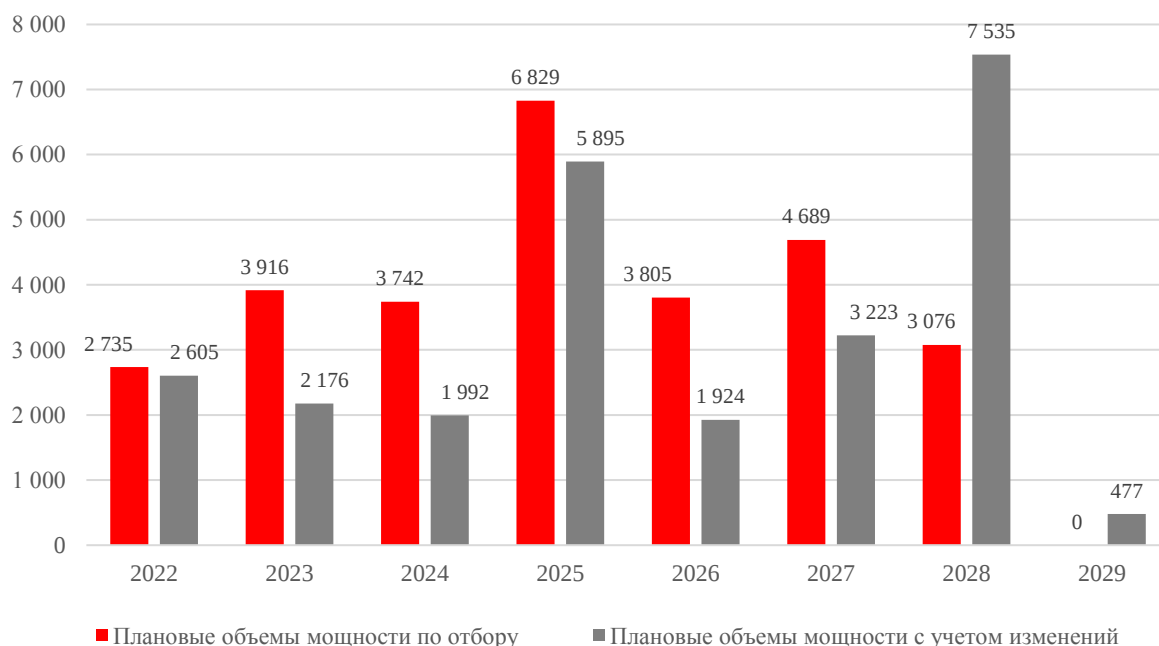

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

План вводов на 2025 год составляет 28 объектов генерации общей установленной мощностью 5 895 МВт, в том числе на 9 месяцев 2025 года – 17 объектов генерации общей установленной мощностью 3 439 МВт. На 3 квартал 2025 года вводы объектов генерации не запланированы. В 3 квартале 2025 года введены 2 объекта генерации суммарной установленной мощностью 325 МВт. За 9 месяцев 2025 года введены 11 объектов генерации общей установленной мощностью 2 710 МВт. Исполнение плана 9 месяцев 2025 года составляет 78,8%.

Рис. 2 Плановый (с учетом изменений состава и параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

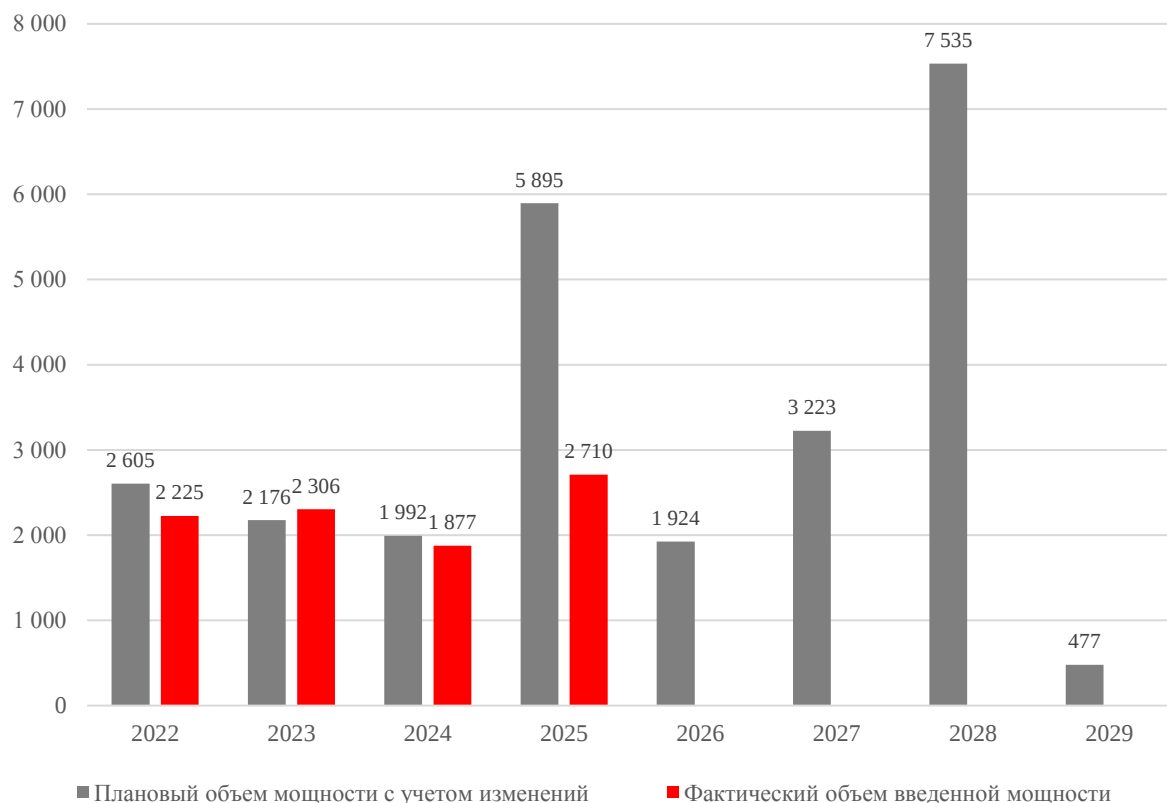

Всего по состоянию на 30.09.2025 введено 42 объекта генерации общей установленной мощностью 9 118,2 МВт, при плане в 51 объект общей установленной мощностью 10 212,2 МВт. Исполнение плана составляет 89,3%.

По состоянию на 30.09.2025 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 35,3%, при общем плане ввода 112 объектов генерации суммарной установленной мощностью 25 827,3 МВт.

По состоянию на 30.09.2025 даты начала поставки мощности нарушили 7 компаний по 9 объектам генерации, общей мощностью 1 094 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 5 до 18 месяцев.

На стадии модернизации находится 32 объекта генерации общей установленной мощностью 4 924,9 МВт, в т.ч.:

- 23 объекта генерации общей установленной мощностью 3 830,9 МВт с плановым периодом модернизации;
- 9 объектов генерации общей установленной мощностью 1 094 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Изменения параметров договоров в 3 квартале 2025 года:

- По инициативе участника в 3 квартале 2025 года изменены даты начала и окончания поставки мощности в связи с уменьшением периода модернизации по 1 объекту генерации установленной мощностью 257 МВт.

III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

Штрафов по КОММод в 3 квартале 2025 года было рассчитано и списано 20,8 млн. рублей (что составляет 0,3% от общего объема рассчитанных штрафов). В период с 2022 – 3 квартал 2025 гг. было рассчитано и списано 6 376,4 млн. рублей (уровень оплаты – 99,99%).
